平成 26 年(2014 年)10 月 2 日(木)　16:00 時点
中部地方整備局

御嶽山噴火に伴う監視カメラの設置状況

○土石流に対する監視体制

新たな噴火及び今後の降雨に伴う土石流などの二次災害に対処するため、
国と県の各機関が連携して土石流の監視体制の整備を進めています。

河川名	監視カメラの 設置・配信状況	ワイヤーセンサー 設置状況	機関名
湯　川	設置予定	設置予定	国土交通省
	設置	設置	長野県
白　川	設置	設置	長野県
濁沢川	10 月 2 日	10 月 2・3 日（予定）	国土交通省
	設置予定	設置予定	森林管理局
冷　川	10 月 2 日	10 月 2・3 日（予定）	国土交通省
鹿ノ瀬川	10 月 2 日	設置予定	国土交通省

監視体制の構築に向けて

国土交通省

新たな噴火及び今後の降雨に伴う土石流などの二次災害に対処するため、国と県の各機関が連携して土石流の監視体制の整備を進めています。

●監視カメラ

①土石流や泥流の発生が懸念される渓流の状況把握や土砂流出状況の把握を行う。

②配信先：
・防災関係機関

③監視カメラ：計7箇所に設置
・中部地方整備局・・・4箇所
・長野県・・・・・・・・・・・2箇所
・中部森林管理局・・・1箇所

●ワイヤーセンサー

○土石流や泥流が発生し、ワイヤーが切れた場合に、防災関係機関へ自動的に通報されます。

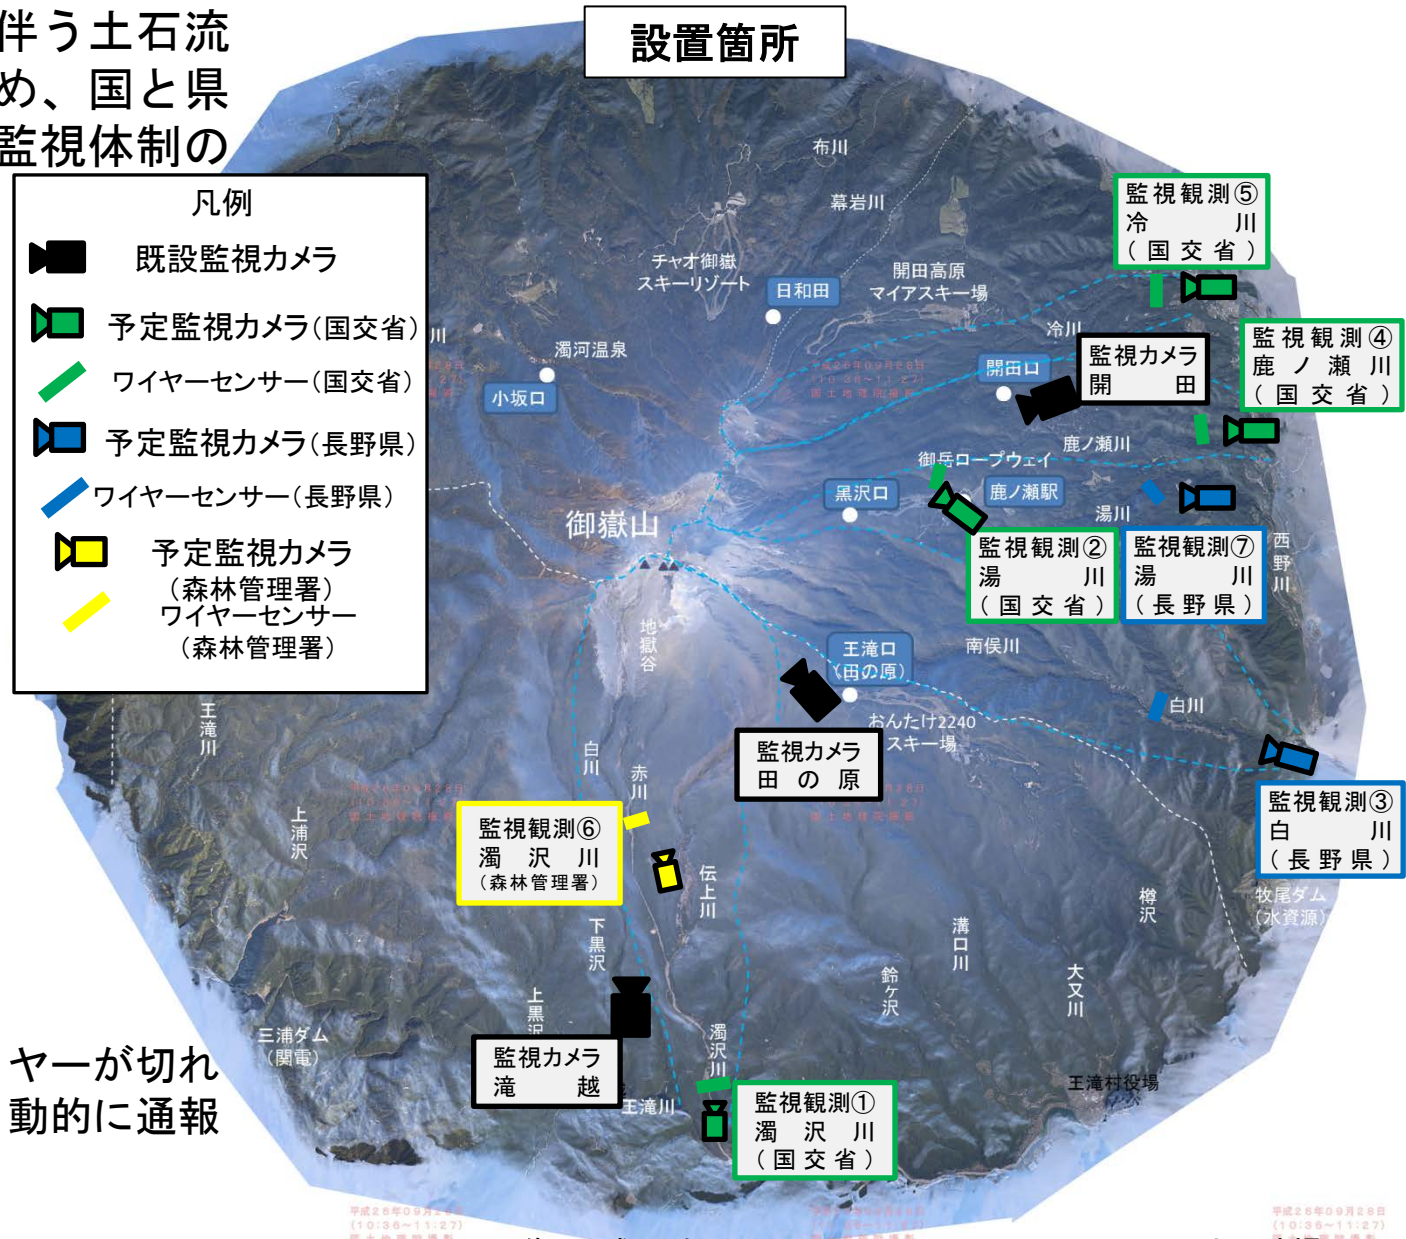

画像：平成26年09月26日（10：36～11：27）国土地理院撮影

監視カメラ、ワイヤーセンサー設置位置図

H26.10.2

＜冷川・下流＞
河川：冷川

設置箇所
ワイヤーセンサー：
　冷川橋上流約30m
カメラ：
　冷川橋

▲ ワイヤーセンサー　● カメラ

＜濁沢川＞
河川：濁沢川

設置箇所
ワイヤーセンサー：
　柳ヶ瀬3号堰堤
カメラ：
　柳ヶ瀬3号堰堤下流10m

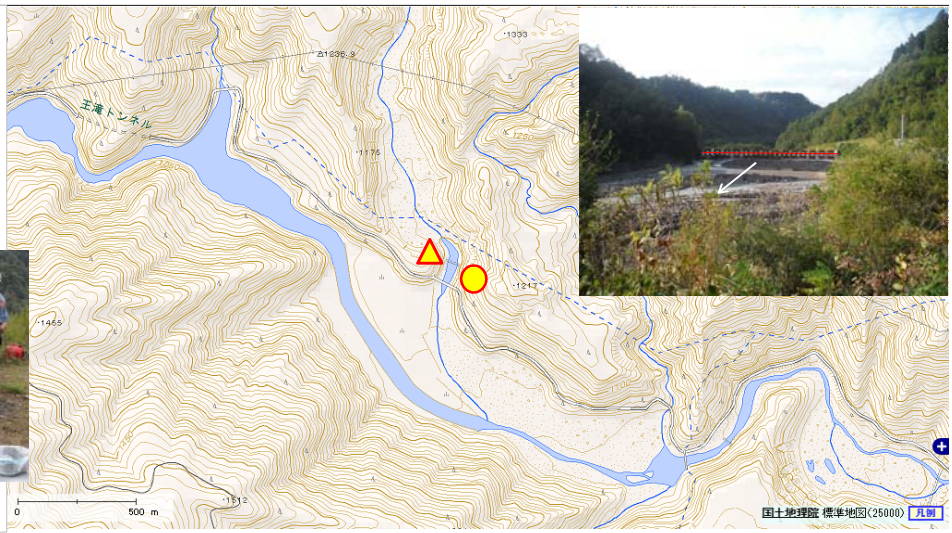

▲ ワイヤーセンサー　● カメラ

＜鹿ノ瀬川＞

河川：鹿ノ瀬川

設置箇所
カメラ：
　鹿ノ瀬橋

● カメラ
