工事進捗状況　（令和５年７月末）

中津川出張所

①

工事名	令和４年度 木曽川水系川上流路工事				
工期	当初 R4.9.1～R5.3.16	変更	R4.9.1～R5.7.31		
受注者名	（株）中島工務店				
進捗率	予定 100	実施	100	差	0.0
今月作業	法面工、流路付属物設置工、後片付け、完成検査				
来月作業	ー				

②

工事名	令和４年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R4.9.1～R5.3.16	変更	R3.9.1～R5.6.30		
受注者名	（株）中島工務店				
進捗率	予定 100	実施	100	差	0
今月作業	ー				
来月作業	ー				

③

工事名	令和４年度 中津川出張所管内整備工事				
工期	当初 R4.12.14～R5.11.30	変更			
受注者名	（株）加藤工務店				
進捗率	予定 ー	実施	62.1	差	ー
今月作業	下平次林道整備、中津川第２砂防堰堤残土処理場整備、荒道管理用道路復旧 等				
来月作業	中津川第２砂防堰堤残土処理場整備、荒道管理用道路復旧、川上橋土捨場整備 等				

④

工事名	令和４年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R5.4.17～R6.2.29	変更	R5.4.17～R6.3.29		
受注者名	（株）鳴海組				
進捗率	予定 9.1	実施	9.6	差	0.5
今月作業	コンクリート堰堤工、仮設工				
来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工				

⑤

工事名	令和４年度 木曽川水系和田沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29	変更			
受注者名	（株）加藤工務店				
進捗率	予定 4.9	実施	5.7	差	0.8
今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工				
来月作業	工場製作工、砂防土工、コンクリート堰堤本体工				

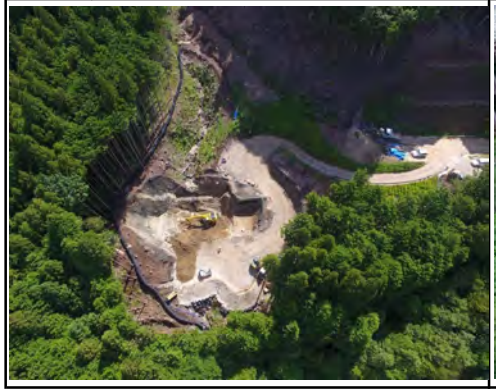

⑥

工事名	令和５年度 木曽川水系地獄谷管理用道路工事				
工期	当初 R5.6.19～R6.3.15	変更			
受注者名	（株）吉川工務店				
進捗率	予定 18.6	実施	18.6	差	0.0
今月作業	準備工、構造物撤去工、仮設工				
来月作業	砂防土工、流路護岸工、構造物撤去工、仮設工				

⑦

工事名	令和５年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R5.7.26～R6.3.13	変更			
受注者名	（株）中島工務店				
進捗率	予定 ー	実施	ー	差	ー
今月作業	準備工				
来月作業	準備工、仮設工				

準　備　工

⑧

工事名					
工期					
受注者名					
進捗率					
今月作業					
来月作業					

工事進捗状況　（令和5年7月末）

妻木出張所

①						
工事名	令和4年度　妻木出張所管内整備工事					
工期	当初 R4.12.1～R5.11.30	変更				
受注者名	（株）藤本組					
進捗率	予定	60	実施	86	差	26
今月作業	防草対策（グリーンベルト整備）市之倉第4堰堤（側溝工）					
来月作業	狭間川（伐採工）					



グリーンベルト整備工

市之倉第4堰堤
（側溝工）

②						
工事名	令和4年度　富士下第2砂防堰堤改築工事					
工期	当初 R5.4.3～R6.2.29	変更				
受注者名	（株）藤本組					
進捗率	予定	21.5	実施	15.6	差	-5.9
今月作業	道路土工,構造物撤去工,砂防土工					
来月作業	砂防土工,堰堤コンクリート工					

③						
工事名	令和5年度　妻木管内砂防施設整備工事					
工期	当初 R5.5.15～R6.3.15	変更				
受注者名	（株）吉川組					
進捗率	予定	12.6	実施	7.4	差	-5.2
今月作業	コンクリート副堰堤工					
来月作業	コンクリート堰堤本体工					

鍛冶ヶ入地区

④						
工事名						
工期	当初	変更				
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

⑤						
工事名						
工期	当初	変更				
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

⑥						
工事名						
工期	当初	変更				
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

⑦						
工事名						
工期	当初	変更				
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

⑧						
工事名						
工期	当初	変更				
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

工事進捗状況　（令和５年７月末）

上松出張所

①

工事名	令和４年度 多治見砂防電気通信設備工事					
工期	当初	R4.9.26～R5.2.28	変更	R5.10.6		
受注者名	朝日電気工業（株）					
進捗率	予定	41.3	実施	41.3	差	0.0
今月作業	書類整理、施工図作成					
来月作業	Ｌ２－ＳＷ更新、ＣＶＣＦ更新工事					

写 真 無 し

②

工事名	令和4年度　木曽川水系　桂川第１砂防堰堤工事					
工期	当初	R4.11.1～R6.1.31	変更	－		
受注者名	大宗土建（株）					
進捗率	予定	51.7	実施	49.3	差	-2.4
今月作業	道路改良 鉄筋挿入工、伐採、調査					
来月作業	道路改良 鉄筋挿入工、調査					

③

工事名	令和4年度　上松出張所管内整備工事					
工期	当初	R4.12.1～R5.11.30	変更	－		
受注者名	大宗土建（株）					
進捗率	予定	－	実施	86.5	差	－
今月作業	境界杭工（指示15梨子沢用地境界杭設置）、応急処理工（指示8滑川法面復旧）（指示11二反田伐採）（指示12滑川備蓄ブロック運搬）（指示14浦川林道復旧）					
来月作業	地質調査（指示8滑川法面復旧）					

④

工事名	令和4年度　木曽川水系　宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事					
工期	当初	R5.4.3～R6.2.29	変更	－		
受注者名	奥田工業(株)					
進捗率	予定	44.9	実施	40.4	差	-4.5
今月作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工（型枠組立・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設）、砂防土工（掘削・土砂運搬）					
来月作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工（型枠組立・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設）、砂防土工（掘削・土砂運搬）					

⑤

工事名	令和4年度　木曽川水系　猿沢砂防施設整備工事					
工期	当初	R5.4.3～R6.1.31	変更	R6.3.29		
受注者名	奥田工業(株)					
進捗率	予定	3.6	実施	1.6	差	-2.0
今月作業	準備工					
来月作業	準備工、仮設工					

⑥

工事名	令和4年度　木曽川水系　和合蛇抜沢沈砂地工事					
工期	当初	R5.4.3～R6.2.29	変更	－		
受注者名	大宗土建（株）					
進捗率	予定	33.5	実施	37.1	差	3.6
今月作業	砂防土工（掘削工・残土処理工）					
来月作業	砂防土工（残土処理工）・コンクリート堰堤工（作業土工）					

⑦

工事名	令和4年度　木曽川水系　十王沢第２砂防堰堤改築工事					
工期	当初	R5.4.28～R6.2.29	変更	－		
受注者名	木曽土建工業（株）					
進捗率	予定	19.0	実施	15.1	差	-3.9
今月作業	コンクリート堰堤工（型枠組立、コンクリート打設）					
来月作業	コンクリート堰堤工（型枠組立、コンクリート打設）					

⑧

工事名	令和5年度　木曽川水系　浦川第２砂防堰堤改築工事					
工期	当初	R5.5.16～R6.3.15	変更	－		
受注者名	奥田工業(株)					
進捗率	予定	11.0	実施	1.2	差	-9.8
今月作業	仮設工（ﾔｰﾄﾞ整備他）					
来月作業	仮設工（仮水路撤去）、構造物撤去工					

工事進捗状況　（令和５年７月末）　　上松出張所

⑨	
工事名	令和5年度　木曽川水系　板橋沢第１砂防堰堤工事
工期	当初 R5.8.7～R6.3.8　　変更
受注者名	神稲建設（株）
進捗率	予定 0.0　実施 0.0　差 0.0
今月作業	令和5年7月14日工事契約締結
来月作業	準備工、施工計画書

写 真 無 し

工事進捗状況　（令和５年７月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①	
工事名	令和３年度　瑞浪恵那道路 中切道路建設工事
工期	当初 R4.3.31～R5.3.24　　変更　　R5.8.30
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	カルバート工、道路土工、道路付属施設工
来月作業	道路付属施設工

②	
工事名	令和３年度　瑞浪恵那道路 中畑道路建設工事
工期	当初 R4.4.1～R5.2.28　　変更　　R5.11.15
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	カルバート工、頂版　型枠、鉄筋、コンクリート
来月作業	カルバート工　脱型、埋戻し

③	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	道路工、舗装工、仮設工、準備工
来月作業	道路工、仮設工、準備工

④	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事
工期	当初 R4.10.3～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）吉川組
今月作業	道路土工、擁壁工、排水構造物工、舗装工、準備工
来月作業	道路土工、擁壁工、排水構造物工、仮設工

⑤	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 上切道路建設工事
工期	当初 R5.1.16～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	U型擁壁工
来月作業	U型擁壁工・仮設工・上切地区重力式擁壁

⑥	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事
工期	当初 R5.4.14～R5.9.29　　変更　　～R5.11.16
受注者名	板垣建設（株）
今月作業	工事用道路工　深礎工
来月作業	深礎工

⑦	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29　　変更
受注者名	（株）鳴海組
今月作業	ボーリング調査
来月作業	仮設工

⑧	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R4.12.6～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）吉川工務店
今月作業	準備工
来月作業	重力式擁壁工、排水構造物工

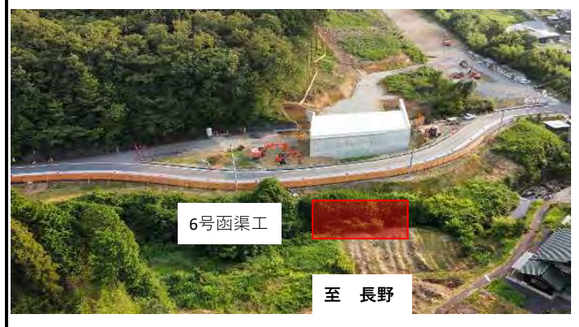

⑨	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29　　変更
受注者名	宇野重工（株）
今月作業	工場製作
来月作業	工場製作

⑩	
工事名	令和4年度　瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.27～R7.2.28　　変更
受注者名	瀧上工業（株）
今月作業	工場製作
来月作業	工場製作

⑪	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5.3.16～R7.2.28　　変更
受注者名	（株）北都鉄工
今月作業	準備工
来月作業	準備工

⑫	
工事名	令和５年度　瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事
工期	当初 R5.7.7～R6.1.31　　変更
受注者名	恵中建設(株)
今月作業	準備工
来月作業	準備工

⑬	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑭	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑮	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

工事進捗状況　（令和５年７月末）

瑞浪国道維持出張所

①	
工事名	令和２年度　多治見国道西部維持修繕工事
工期	当初 R2.10.30～R5.10.31　　変更
受注者名	日本ハイウエイサービス（株）
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他

②	
工事名	令和４年度　多治見国道東部維持修繕工事
工期	当初 R4.10.1～R6.10.31　　変更
受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス
今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工
来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工

③		完
工事名	令和３年度　多治見国道中津川地区整備工事	
工期	当初 R4.4.30～R4.12.16　　変更　　R5.6.30	
受注者名	（株）加藤工務店	
今月作業		
来月作業		

④		完
工事名	令和４年度　多治見国道標識工事	
工期	当初 R4.4.30～R5.2.28　　変更　　R5.5.31	
受注者名	（株）キクテック	
今月作業		
来月作業		

⑤	
工事名	令和４年度　多治見国道電気通信設備工事
工期	当初 R4.8.2～R5.2.28　　変更　　R5.8.18
受注者名	エフコム（株）
今月作業	
来月作業	8月28日　完成検査

⑥	
工事名	令和４年度　多治見国道防災工事
工期	当初 R5.3.1～R6.2.28　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	仮設工　仮設設備工（モノレール架設）
来月作業	仮設工　防護施設工、足場工、仮設設備工

⑦	
工事名	令和４年度　多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5.3.13～R6.1.31　　変更　　R5.11.29
受注者名	（株）梅田組
今月作業	橋梁床版工、橋梁付属物工、現場塗装工、仮設工
来月作業	橋梁付属物工、橋梁補修工

⑧	
工事名	令和４年度　多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事
工期	当初 R5.3.30～R6.2.28　　変更
受注者名	徳倉建設（株）
今月作業	準備工、技術管理、事業損失防止、充填工
来月作業	準備工、技術管理、充填孔設置工

⑨	
工事名	令和４年度　多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初 R5.4.3～R6.2.28　　変更
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	準備工
来月作業	準備工、地山補強土工

⑩	
工事名	令和４年度　多治見国道照明設備工事
工期	当初 R5.4.20～R6.2.29　　変更
受注者名	（株）関電工事
今月作業	準備工
来月作業	準備工

写真

⑪	
工事名	令和４年度　多治見国道瑞浪維持管内整備工事
工期	当初 R5.4.24～R6.1.31　　変更
受注者名	セントラル建設（株）
今月作業	準備工、地下横断歩道補修工
来月作業	準備工、地下横断歩道補修工

⑫	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑬	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑭	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑮	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真
