工事進捗状況　（令和５年８月末）

中津川出張所

①

工事名	令和４年度 木曽川水系川上流路工事				
工期	当初 R4.9.1～R5.3.16		変更	R4.9.1～R5.7.31	
受注者名	（株）中島工務店				
受注金額	当初	110,000,000	変更	161,469,000	
進捗率	予定	100	実施	100	差 0.0
今月作業	ー				
来月作業	ー				

②

工事名	令和４年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R4.9.1～R5.3.16		変更	R3.9.1～R5.6.30	
受注者名	（株）中島工務店				
受注金額	当初	128,700,000	変更	151,052,000	
進捗率	予定	100	実施	100	差 0
今月作業	ー				
来月作業	ー				

③

工事名	令和４年度 中津川出張所管内整備工事				
工期	当初 R4.12.14～R5.11.30		変更		
受注者名	（株）加藤工務店				
受注金額	当初	104,500,000	変更		
進捗率	予定	ー	実施	65.7	差 ー
今月作業	荒道管理用道路復旧、下平次林道整備、中津川第２砂防堰堤残土処理場整備、川上橋土捨場整備 等				
来月作業	中津川第２砂防堰堤残土処理場整備、川上橋土捨場整備、川上川流路工第7床固工下流右岸補修 等				

④

工事名	令和４年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R5.4.17～R6.2.29		変更	R5.4.17～R6.3.29	
受注者名	（株）鳴海組				
受注金額	当初	126,500,000	変更		
進捗率	予定	13.8	実施	13.8	差 0
今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工				
来月作業	仮設工				

⑤

工事名	令和４年度 木曽川水系和田沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29		変更		
受注者名	（株）加藤工務店				
受注金額	当初	137,500,000	変更	139,656,000	
進捗率	予定	19.3	実施	17.8	差 -1.5
今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工				
来月作業	工場製作工、コンクリート堰堤工、舗装工				

⑥

工事名	令和５年度 木曽川水系地獄谷管理用道路工事				
工期	当初 R5.6.19～R6.3.15		変更		
受注者名	（株）吉川工務店				
受注金額	当初	73,150,000	変更		
進捗率	予定	22.6	実施	31.8	差 9.2
今月作業	砂防土工、流路護岸工、構造物撤去工、仮設工				
来月作業	砂防土工、流路護岸工				

⑦

工事名	令和５年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R5.7.26～R6.3.13		変更		
受注者名	（株）中島工務店				
受注金額	当初	146,850,000	変更		
進捗率	予定	1.2	実施	1.2	差 0.0
今月作業	準備工、仮設工				
来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工				

⑧

工事名	令和５年度 木曽川水系荒道谷砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R5.8.1～R6.3.8		変更		
受注者名	（株）鳴海組				
受注金額	当初	150,700,000	変更		
進捗率	予定	0.5	実施	0.5	差 0.0
今月作業	準備工				
来月作業	準備工、コンクリート堰堤工、構造物撤去工、仮設工				

準　備　工

工事進捗状況　（令和５年８月末）　　中津川出張所

⑨						
工事名	令和５年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事					
工期	当初 R5.8.1～R6.3.8		変更			
受注者名	(株)中島工務店					
受注金額	当初	134,750,000	変更			
進捗率	予定	1.0	実施	1.0	差	0.0
今月作業	準備工					
来月作業	準備工、仮設工					

準　備　工

⑩						
工事名	令和５年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事					
工期	当初 R5.9.25～R6.3.13		変更			
受注者名	(株)吉川工務店					
受注金額	当初	129,800,000	変更			
進捗率	予定	ー	実施	ー	差	ー
今月作業	ー					
来月作業	ー					

契　約　済

工事名						
工期	当初		変更			
受注者名						
受注金額	当初		変更			
進捗率	予定		実施		差	
今月作業						
来月作業						

工事名						
工期	当初		変更			
受注者名						
受注金額	当初		変更			
進捗率	予定		実施		差	
今月作業						
来月作業						

工事名						
工期	当初		変更			
受注者名						
受注金額	当初		変更			
進捗率	予定		実施		差	
今月作業						
来月作業						

工事名						
工期	当初		変更			
受注者名						
受注金額	当初		変更			
進捗率	予定		実施		差	
今月作業						
来月作業						

工事名						
工期	当初		変更			
受注者名						
受注金額	当初		変更			
進捗率	予定		実施		差	
今月作業						
来月作業						

工事名						
工期	当初		変更			
受注者名						
受注金額	当初		変更			
進捗率	予定		実施		差	
今月作業						
来月作業						

工事進捗状況　（令和5年8月末）

妻木出張所

①

工事名	令和4年度　妻木出張所管内整備工事					
工期	当初 R4.12.1～R5.11.30　変更					
受注者名	（株）藤本組					
進捗率	予定	70	実施	108	差	38
今月作業	生田川護岸【支障木伐採】・狭間川伐採					
来月作業	利用土搬出					

生田護岸【支障木伐採】

狭間川伐採

②

工事名	令和4年度　富士下第2砂防堰堤改築工事					
工期	当初 R5.4.3～R6.2.29　変更					
受注者名	（株）藤本組					
進捗率	予定	23.5	実施	17.6	差	-5.9
今月作業	砂防土工　掘削、運搬					
来月作業	コンクリート堰堤工　作業土工、コンクリート工					

③

工事名	令和5年度　妻木管内砂防施設整備工事					
工期	当初 R5.5.15～R6.3.15　変更					
受注者名	（株）吉川組					
進捗率	予定	20.2	実施	16.4	差	-3.8
今月作業	準備工　立木伐採（寺下富士）コンクリート堰堤本体工（鍛冶ヶ入）					
来月作業	仮設工　工事用道路（寺下富士）コンクリート堰堤本体工（鍛冶ヶ入）					

鍛冶ヶ入地区

④

工事名	令和5年度　寺下第3砂防堰堤改築工事					
工期	当初 R5.8.1～R6.3.13　変更					
受注者名	（株）藤本組					
進捗率	予定	0.0	実施	0.0	差	0
今月作業	準備工					
来月作業	準備工、仮設工					

⑤

工事名						
工期	当初　変更					
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

⑥

工事名						
工期	当初　変更					
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

⑦

工事名						
工期	当初　変更					
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

⑧

工事名						
工期	当初　変更					
受注者名						
進捗率	予定		実施		差	0
今月作業						
来月作業						

工事進捗状況　（令和５年８月末）

上松出張所　　No. 1

①					
工事名	令和４年度 多治見砂防電気通信設備工事				
工期	当初	R4.9.26～R5.2.28	変更	R5.10.6	
受注者名	朝日電気工業（株）				
進捗率	予定	46.4	実施	51.6	差 5.2
今月作業	Ｌ２－ＳＷ更新、ＣＶＣＦ更新工事、土石流観測装置搬入				
来月作業	土石流観測装置更新工事				

②					
工事名	令和4年度 木曽川水系 桂川第１砂防堰堤工事				
工期	当初	R4.11.1～R6.1.31	変更	－	
受注者名	大宗土建（株）				
進捗率	予定	56.7	実施	55.8	差 -0.9
今月作業	道路改良 鉄筋挿入工、調査				
来月作業	道路改良 植生基材吹付工、崩壊土砂除去				

③					
工事名	令和4年度 上松出張所管内整備工事				
工期	当初	R4.12.1～R5.11.30	変更	－	
受注者名	大宗土建（株）				
進捗率	予定	ー	実施	98.8	差 －
今月作業	地質調査（指示8滑川法面復旧）				
来月作業	地質調査（指示8滑川法面復旧）				

④					
工事名	令和4年度 木曽川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事				
工期	当初	R5.4.3～R6.2.29	変更	－	
受注者名	奥田工業(株)				
進捗率	予定	61.5	実施	61.5	差 0.0
今月作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工（型枠組立・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設）、砂防土工（掘削・土砂運搬）				
来月作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工、鋼製堰堤工、砂防土工（掘削・土砂運搬）				

⑤					
工事名	令和4年度 木曽川水系 猿沢砂防施設整備工事				
工期	当初	R5.4.3～R6.1.31	変更	R6.3.29	
受注者名	奥田工業(株)				
進捗率	予定	4.8	実施	1.9	差 -2.9
今月作業	準備工				
来月作業	伐採工、工事用道路工				

⑥					
工事名	令和4年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				
工期	当初	R5.4.3～R6.2.29	変更	－	
受注者名	大宗土建（株）				
進捗率	予定	63.9	実施	63.9	差 0.0
今月作業	砂防土工（残土処理工）・コンクリート堰堤工（作業土工）				
来月作業	砂防土工（残土処理工）・コンクリート堰堤工（作業土工）・法面工				

⑦					
工事名	令和4年度 木曽川水系 十王沢第２砂防堰堤改築工事				
工期	当初	R5.4.28～R6.2.29	変更	－	
受注者名	木曽土建工業（株）				
進捗率	予定	25.7	実施	21.9	差 -3.8
今月作業	コンクリート堰堤工（型枠組立、コンクリート打設）				
来月作業	コンクリート堰堤工（型枠組立、コンクリート打設）				

⑧					
工事名	令和5年度 木曽川水系 浦川第２砂防堰堤改築工事				
工期	当初	R5.5.16～R6.3.15	変更	－	
受注者名	奥田工業(株)				
進捗率	予定	2.6	実施	2.6	差 0.0
今月作業	仮設工（仮水路撤去）ヤード整備				
来月作業	土工（作業土工、盛土撤去）構造物撤去工				

工事進捗状況　（令和５年８月末）　上松出張所　No.2

⑨					
工事名	令和5年度　木曽川水系　板橋沢第１砂防堰堤工事				
工期	当初 R5.8.7～R6.3.8	変更			
受注者名	神稲建設（株）				
進捗率	予定	0.0	実施 0.0	差	0.0
今月作業	準備工・施工計画書				
来月作業	法面工・鉄筋挿入工				

工事進捗状況　（令和５年８月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①

工事名	令和３年度　瑞浪恵那道路 中切道路建設工事
工期	当初 R4.3.31～R5.3.24　　変更　　R5.8.30
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	
来月作業	

完成

②

工事名	令和３年度　瑞浪恵那道路 中畑道路建設工事
工期	当初 R4.4.1～R5.2.28　　変更　　R5.11.15
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	カルバート工、頂版　型枠、鉄筋、コンクリート
来月作業	カルバート工　脱型、埋戻し

③

工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	道路工、舗装工、仮設工、準備工
来月作業	道路工、舗装工、仮設工、準備工、土工

④

工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事
工期	当初 R4.10.3～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）吉川組
今月作業	道路土工、排水構造物工、仮設工
来月作業	道路土工、排水構造物工、舗装工、区画線工、防護柵工、仮設工

⑤

工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 上切道路建設工事
工期	当初 R5.1.16～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	U型擁壁工
来月作業	U型擁壁工・仮設工・上切地区重力式擁壁

⑥

工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事
工期	当初 R5.4.14～R5.9.29　　変更　　～R5.11.16
受注者名	板垣建設（株）
今月作業	深礎工
来月作業	深礎工　工事用道路工　排水工

⑦

工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29　　変更
受注者名	（株）鳴海組
今月作業	仮設工（準備）
来月作業	仮設工

⑧

工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R4.12.6～R6.2.29　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）吉川工務店
今月作業	地盤改良工、工事用道路工
来月作業	舗装工、仮橋工

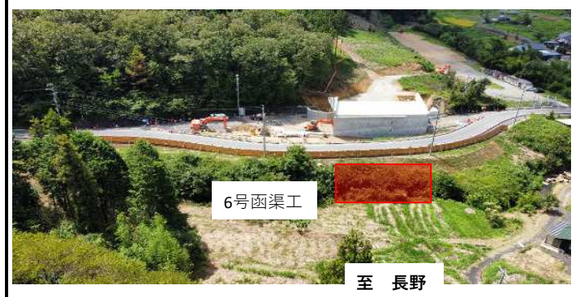

⑨	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29　　変更
受注者名	宇野重工（株）
今月作業	工場製作
来月作業	工場製作

⑩	
工事名	令和4年度　瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.27～R7.2.28　　変更
受注者名	瀧上工業（株）
今月作業	工場製作
来月作業	工場製作

⑪	
工事名	令和４年度　瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5.3.16～R7.2.28　　変更
受注者名	（株）北都鉄工
今月作業	工場製作
来月作業	工場製作

⑫	
工事名	令和５年度　瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事
工期	当初 R5.7.7～R6.1.31　　変更
受注者名	恵中建設(株)
今月作業	準備工
来月作業	準備工

⑬	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑭	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑮	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

工事進捗状況　（令和５年８月末）

瑞浪国道維持出張所

①	
工事名	令和２年度　多治見国道西部維持修繕工事
工期	当初 R2.10.30～R5.10.31　　変更
受注者名	日本ハイウエイサービス（株）
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他

②	
工事名	令和４年度　多治見国道東部維持修繕工事
工期	当初 R4.10.1～R6.10.31　　変更
受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス
今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工
来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工

③ 完	
工事名	令和３年度　多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初 R4.4.30～R4.12.16　　変更　　R5.6.30
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	
来月作業	

④ 完	
工事名	令和４年度　多治見国道標識工事
工期	当初 R4.4.30～R5.2.28　　変更　　R5.5.31
受注者名	（株）キクテック
今月作業	
来月作業	

⑤ 完	
工事名	令和４年度　多治見国道電気通信設備工事
工期	当初 R4.8.2～R5.2.28　　変更　　R5.8.18
受注者名	エフコム（株）
今月作業	
来月作業	

⑥	
工事名	令和４年度　多治見国道防災工事
工期	当初 R5.3.1～R6.2.28　　変更　　R6.3.29
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	仮設工　モノレール架設、仮設防護
来月作業	小割除去、ロープ掛、仮設足場

⑦	
工事名	令和４年度　多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5.3.13～R6.1.31　　変更　　R5.11.29
受注者名	（株）梅田組
今月作業	橋梁付属物工、橋梁補修工（山口工区）
来月作業	橋梁補修工、仮設工（多治見工区）

⑧	
工事名	令和４年度　多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事
工期	当初 R5.3.30～R6.2.28　　変更
受注者名	徳倉建設（株）
今月作業	準備工、技術管理、充填孔設置工
来月作業	準備工、技術管理、充填孔設置工

⑨	
工事名	令和４年度　多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初 R5.4.3～R6.2.28　　変更
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	準備工
来月作業	準備工、地山補強土工

⑩	
工事名	令和４年度　多治見国道照明設備工事
工期	当初 R5.4.20～R6.2.29　　変更
受注者名	（株）関電工事
今月作業	準備工
来月作業	準備工

⑪	
工事名	令和４年度　多治見国道瑞浪維持管内整備工事
工期	当初 R5.4.24～R6.1.31　　変更
受注者名	セントラル建設（株）
今月作業	準備工、地下横断歩道補修工
来月作業	準備工、地下横断歩道補修工

⑫	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑬	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑭	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑮	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真
