# 工事進捗状況　（令和６年４月末）

中津川出張所

①

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和５年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事 | | | | |
| 工期 | 当初 R5.8.1～R6.3.8 | | 変更 R5.8.1～R6.7.31 | | |
| 受注者名 | (株)中島工務店 | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 134,750,000 | 変更 | 138,424,000 | |
| 進捗率 | 予定 83.0 | 実施 82.4 | 差 -0.6 | | |
| 今月作業 | 大型土のう設置、切・盛土 | | | | |
| 来月作業 | 伐採木搬出、切・盛土、大型土のう設置 | | | | |

②

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和５年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事 | | | | |
| 工期 | 当初 R5.9.25～R6.3.13 | | 変更 R5.9.25～R6.10.3 | | |
| 受注者名 | (株)吉川工務店 | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 129,800,000 | 変更 | | |
| 進捗率 | 予定 36.1 | 実施 34.9 | 差 -1.2 | | |
| 今月作業 | 道路土工(盛土)、落石雪害防止工、立木調査 | | | | |
| 来月作業 | 落石雪害防止工、砕石舗装工、立木調査 等 | | | | |

③

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和５年度 中津川出張所管内整備工事 | | | | |
| 工期 | 当初 R5.12.1～R6.11.29 | | 変更 | | |
| 受注者名 | (株)鳴海組 | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 97,900,000 | 変更 | | |
| 進捗率 | 予定 ー | 実施 28.1 | 差 ー | | |
| 今月作業 | 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、冷川排水路整備、大玉石採取 等 | | | | |
| 来月作業 | 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、砂防教室補助、和田沢砂防堰堤周辺整備 等 | | | | |

④

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和５年度 木曽川水系地獄谷除石工事 | | | | |
| 工期 | 当初 R6.4.8～R7.2.28 | | 変更 | | |
| 受注者名 | (株)吉川工務店 | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 155,100,000 | 変更 | | |
| 進捗率 | 予定 2.7 | 実施 2.7 | 差 0.0 | | |
| 今月作業 | 重力式擁壁、仮締切、護岸床堀 | | | | |
| 来月作業 | 重力式擁壁、仮締切、護岸床堀、排水工、ヤード整備 | | | | |

⑤

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和５年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事 | | | | |
| 工期 | 当初 R6.4.11～R7.2.28 | | 変更 | | |
| 受注者名 | (株)鳴海組 | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 181,500,000 | 変更 | | |
| 進捗率 | 予定 0.8 | 実施 0.8 | 差 0.0 | | |
| 今月作業 | 重機足場盛土の採取、搬入 | | | | |
| 来月作業 | 重機足場盛土、切土、法枠工 | | | | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 受注金額 | |
| 進捗率 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 受注金額 | |
| 進捗率 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 受注金額 | |
| 進捗率 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

# 工事進捗状況　（令和6年4月末）

妻木出張所

| ① | | | | | | ② | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　妻木出張所管内整備工事 | | | | | 工事名 | 令和6年度　庄内川水系寺下第３砂防堰堤改築工事 | | | | |
| 工期 | 当初 R5.12.11～R6.11.29 | | 変更 | | | 工期 | 当初 R6.4.27～R7.2.28 | | 変更 | | |
| 受注者名 | （株）藤本組 | | | | | 受注者名 | （株）藤本組 | | | | |
| 進捗率 | 予定 | ー | 実施 | 34.2 | 差 ー | 進捗率 | 予定 | 0 | 実施 | 0 | 差 0 |
| 今月作業 | 指示２【梅平護岸整備】，指示3【鍛冶ヶ入管理用道路整備】 | | | | | 今月作業 | ー | | | | |
| 来月作業 | 指示２【梅平護岸整備】，指示3【鍛冶ヶ入管理用道路整備】，指示4【生田川遊砂工部整備】 | | | | | 来月作業 | 準備工 | | | | |

指示２：梅平川整備

指示３：鍛冶ヶ入川管理用道路整備

| ③ | | | | | | ④ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | | | | | | 工事名 | | | | | |
| 工期 | 当初 | | 変更 | | | 工期 | 当初 | | 変更 | | |
| 受注者名 | | | | | | 受注者名 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 0 | 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 0 |
| 今月作業 | | | | | | 今月作業 | | | | | |
| 来月作業 | | | | | | 来月作業 | | | | | |

| ⑤ | | | | | | ⑥ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | | | | | | 工事名 | | | | | |
| 工期 | 当初 | | 変更 | | | 工期 | 当初 | | 変更 | | |
| 受注者名 | | | | | | 受注者名 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 0 | 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 0 |
| 今月作業 | | | | | | 今月作業 | | | | | |
| 来月作業 | | | | | | 来月作業 | | | | | |

| ⑦ | | | | | | ⑧ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | | | | | | 工事名 | | | | | |
| 工期 | 当初 | | 変更 | | | 工期 | 当初 | | 変更 | | |
| 受注者名 | | | | | | 受注者名 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 0 | 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 0 |
| 今月作業 | | | | | | 今月作業 | | | | | |
| 来月作業 | | | | | | 来月作業 | | | | | |

# 工事進捗状況　（令和６年４月末）

上松出張所

| ① | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　上松出張所管内整備工事 | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | R5.12.1～R6.11.29 | 変更 | － | | | | |
| 受注者名 | 木曽土建工業（株） | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 100,100,000 | 変更 | 100,100,000 | | | | |
| 進捗率 | 予定 | － | 実施 | 19.6 | 差 | － | | |
| 今月作業 | 南木曽町：神戸沢電線支障木除去整備 | | | | | | | |
| 来月作業 | 上松町：北股沢崩壊法面対策 | | | | | | | |

| ② | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　木曽川水系　深沢砂防堰堤工事 | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | R5.12.11～R7.1.31 | 変更 | | | | | |
| 受注者名 | 奥田工業(株) | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 172,700,000 | 変更 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | 22.5 | 実施 | 22.5 | 差 | 0.0 | | |
| 今月作業 | （深沢）コンクリート堰堤工、（猿沢）仮設工 | | | | | | | |
| 来月作業 | （深沢）コンクリート堰堤工、（猿沢）仮設工、強じんワイヤーネットエ | | | | | | | |

| ③ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　木曽川水系　和合蛇抜沢沈砂地工事 | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | R6.3.13～R7.2.28 | 変更 | | | | | |
| 受注者名 | 大宗土建(株) | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 166,980,000 | 変更 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | 3.3 | 実施 | 4.2 | 差 | 0.9 | | |
| 今月作業 | 準備工・構造物撤去工・工事用道路工・残土処理工 | | | | | | | |
| 来月作業 | 構造物撤去工・工事用道路工・残土処理工 | | | | | | | |

| ④ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　木曽川水系　十王沢第２砂防堰堤改築工事 | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | R6.3.14～R7.2.28 | 変更 | | | | | |
| 受注者名 | 木曽土建工業（株） | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 75,240,000 | 変更 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | 5.1 | 実施 | 1.3 | 差 | -3.8 | | |
| 今月作業 | 準備工 | | | | | | | |
| 来月作業 | 仮設工　構造物撤去工　作業土工（床掘） | | | | | | | |

| ⑤ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　木曽川水系　桂川第１砂防堰堤工事 | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | R6.4.1～R7.2.28 | 変更 | | | | | |
| 受注者名 | 大宗土建(株) | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | 173,580,000 | 変更 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | 0.1 | 実施 | 0.1 | 差 | 0.0 | | |
| 今月作業 | 準備工 | | | | | | | |
| 来月作業 | 準備工 | | | | | | | |

| ⑥ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和6年度　木曽川水系　浦川第２砂防堰堤改築工事 | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | － | 変更 | | | | | |
| 受注者名 | 奥田工業(株) | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | － | 変更 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | － | 実施 | － | 差 | | | |
| 今月作業 | － | | | | | | | |
| 来月作業 | 工事契約 | | | | | | | |

**写真無し**

| ⑦ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | | 変更 | | | | | |
| 受注者名 | | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | | 変更 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 | 0.0 | | |
| 今月作業 | | | | | | | | |
| 来月作業 | | | | | | | | |

| ⑧ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | | | | | | | | |
| 工期 | 当初 | | 変更 | | | | | |
| 受注者名 | | | | | | | | |
| 受注金額 | 当初 | | 変更 | | | | | |
| 進捗率 | 予定 | | 実施 | | 差 | 0.0 | | |
| 今月作業 | | | | | | | | |
| 来月作業 | | | | | | | | |

# 工事進捗状況　（令和６年　４月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

| ① | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事 |
| 工期 | 当初 R4.9.9～R6.2.29　変更 R6.6.28 |
| 受注者名 | （株）中島工務店 |
| 今月作業 | 道路土工、舗装工、仮設工 |
| 来月作業 | 舗装工、仮設工 |

| ② | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事 |
| 工期 | 当初 R4.10.3～R6.2.29　変更 R6.5.31 |
| 受注者名 | （株）吉川組 |
| 今月作業 | 道路土工、橋台工 |
| 来月作業 | 橋台工 |

| ③ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事 |
| 工期 | 当初 R5.1.16～R6.2.29　変更 R6.6.28 |
| 受注者名 | （株）加藤工務店 |
| 今月作業 | 6号函渠工・排水工 |
| 来月作業 | 6号函渠工・排水工・ブロック積 |

| ④ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事 |
| 工期 | 当初 R4.12.6～R6.2.29　変更 R6.6.28 |
| 受注者名 | （株）吉川工務店 |
| 今月作業 | カルバート工、石・ブロック積工、仮設工 |
| 来月作業 | 石・ブロック積工、仮設工、カルバート工 |

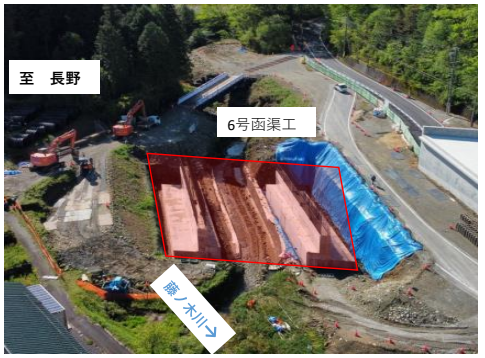


| ⑤ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事 |
| 工期 | 当初 R4.9.27～R7.2.28　変更 |
| 受注者名 | 瀧上工業（株） |
| 今月作業 | 工場製作 |
| 来月作業 | 工場製作 |

| ⑥ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事 |
| 工期 | 当初 R5.3.16～R7.2.28　変更 |
| 受注者名 | （株）北都鉄工 |
| 今月作業 | 工場製作 |
| 来月作業 | 工場製作 |

| ⑦ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和５年度　瑞浪恵那道路 中切地区下部工事 |
| 工期 | 当初 R5.9.1～R7.2.28　変更 R7.3.28 |
| 受注者名 | （株）中島工務店 |
| 今月作業 | 準備工、法覆護岸工、排水構造物工 |
| 来月作業 | 準備工、排水構造物工、カルバート工、仮設工 |

| ⑧ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和５年度　瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事 |
| 工期 | 当初 R6.4.12～R7.2.28　変更 |
| 受注者名 | （株）加藤工務店 |
| 今月作業 | 準備工、道路土工 |
| 来月作業 | 道路土工、カルバート工 |

| ⑨ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和５年度　瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事 |
| 工期 | 当初 R6.4.8～R7.2.28　　変更 |
| 受注者名 | （株）吉川工務店 |
| 今月作業 | 準備工、鋼橋足場等設置工、床版工 |
| 来月作業 | 鋼橋足場等設置工、床版工、橋梁付属物工 |

| ⑩ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和５年度　瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事 |
| 工期 | 当初 R6.4.15～R7.2.28　　変更 |
| 受注者名 | 恵中建設㈱ |
| 今月作業 | 準備工 |
| 来月作業 | 準備工、仮設工 |

| ⑪ | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

写真

| ⑫ | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

写真

| ⑬ | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

写真

| ⑭ | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

写真

| ⑮ | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

写真

| ⑯ | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | |
| 受注者名 | |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

写真

# 工事進捗状況　（令和６年４月末）

瑞浪国道維持出張所

| ① | |
|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　多治見国道西部維持修繕工事 |
| 工期 | 当初 R5.10.1～R7.10.31　　変更 |
| 受注者名 | 日本ハイウエイサービス（株） |
| 今月作業 | 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他 |
| 来月作業 | 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他 |

| ② | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　多治見国道東部維持修繕工事 |
| 工期 | 当初 R4.10.1～R6.10.31　　変更 |
| 受注者名 | （有）木曽ハイウェーサービス |
| 今月作業 | 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工 |
| 来月作業 | 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工 |

82.000上　　区画線工（カラー舗装）

| ③ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和４年度　多治見国道中津川地区整備工事 |
| 工期 | 当初 R5.4.3～R6.2.28　　変更　　R6.6.28 |
| 受注者名 | （株）加藤工務店 |
| 今月作業 | 地山補強土工（ルートパイル） |
| 来月作業 | 地山補強土工（ルートパイル） |

| ④ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　多治見国道橋梁補修工事 |
| 工期 | 当初　R5.12.11～R7.2.28　　変更 |
| 受注者名 | ㈱　梅田組 |
| 今月作業 | 多治見地区　舗装工　橋梁付属物工　仮設工 |
| 来月作業 | 土岐地区　仮設工　鋼桁工　橋梁付属物工 |

| ⑤ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　多治見国道交通事故対策工事 |
| 工期 | 当初　R6.2.1～R6.9.30　　変更 |
| 受注者名 | セントラル建設㈱ |
| 今月作業 | 準備工 |
| 来月作業 | 準備工・防護柵工 |

| ⑥ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　多治見国道管内整備工事 |
| 工期 | 当初　R6.3.14～R7.2.28　　変更 |
| 受注者名 | セントラル建設㈱ |
| 今月作業 | 準備工・法面工 |
| 来月作業 | 法面工 |

| ⑦ | |
|---|---|
| 工事名 | 令和5年度　多治見国道中津川地区整備工事 |
| 工期 | 当初　R6.5.7～R7.2.28　　変更 |
| 受注者名 | ㈱加藤工務店 |
| 今月作業 | |
| 来月作業 | |

写真

| ⑧ | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

写真
