工事進捗状況　（令和８年９月末）

中津川出張所

①	
工事名	令和７年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事
工期	当初 R7.8.20～R8.6.30　　変更
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	
来月作業	



②	
工事名	令和7年度　多治見砂防電気通信設備工事
工期	当初 R4.7.8～R8.2.27　　変更　R9.1.20
受注者名	（株）ミライト・ワン
今月作業	上松地区：埋設配管工、仮舗装
来月作業	上松地区：埋設配管工、舗装工、中津川地区：準備工



③	
工事名	令和7年度 木曽川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R7.10.20～R8.6.30　　変更　R8.9.11
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	準備工
来月作業	



④	
工事名	令和７年度 中津川出張所管内整備工事
工期	当初 R7.12.1～R8.11.30　　変更
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	恵那山林道整備、温川第4砂防堰堤整備、四ツ目遊砂工整備
来月作業	恵那山林道整備、本谷第4砂防堰堤土砂搬出



⑤	
工事名	令和７年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事
工期	当初 R8.2.16～R9.1.29　　変更
受注者名	（株）鳴海組
今月作業	堰堤工 型枠 Co打設 鉄筋　構造物取壊し 殻運搬
来月作業	準備工



⑥	
工事名	令和７年度 木曽川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R8.3.23～R9.1.29　　変更
受注者名	（株）吉川工務店
今月作業	掘削工 残土処理工　仮設工 工事用道路工 仮水路工
来月作業	残土処理工　仮設工 工事用道路工



⑦	
工事名	令和７年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事
工期	当初 R8.4.1～R9.1.29　　変更
受注者名	（株）吉川工務店
今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工
来月作業	コンクリート堰堤工



⑧	
工事名	令和８年度 木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事
工期	当初 R8.5.11～R9.2.26　　変更
受注者名	（株）鳴海組
今月作業	コンクリート堰堤工（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、人工地山）
来月作業	コンクリート堰堤工、砂防土工（土砂搬入、採取）



工事進捗状況　（令和８年９月末）

中津川出張所

⑨	
工事名	令和８年度 木曽川水系子野川第３砂防堰堤工事
工期	当初 R8.10.1～R9.6.30　　変更
受注者名	（株）中島工務店
今月作業	準備工
来月作業	

準備工

⑩	
工事名	令和８年度 木曽川水系和田沢第２砂防堰堤工事
工期	当初 R8.11.2～R9.6.30　　変更
受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	準備工
来月作業	

準備工

⑪	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑫	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑬	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑭	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑮	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

工事進捗状況　（令和8年9月末）

庄内川水系砂防

①		②		③		④	
工事名	令和7年度　妻木出張所管内整備工事	工事名	令和7年度　庄内川水系富士下第4第5砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和8年度　庄内川水系砂防施設改築工事	工事名	
工期	当初 R7.12.1　～R8.11.30　変更	工期	当初　R8.4.20～R8.12.18　変更	工期	当初 R8.4.20　～R9.2.26　変更	工期	当初　変更
受注者名	（株）藤本組	受注者名	（株）吉川組	受注者名	（株）藤本組	受注者名	
今月作業	指示21　降雨後応急作業	今月作業	構造物撤去工,石･ブロック積(張)工,道路土工	今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業	
来月作業	指示12　寺下流路護岸運搬経路舗装修繕　指示22　砕山資材置場整備	来月作業	道路土工,石･ブロック積(張)工	来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工	来月作業	



指示21　降雨後応急作業







寺下地区

富士下地区



⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初　変更	工期	当初　変更	工期	当初　変更	工期	当初　変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況　（令和８年　９月末）

上松出張所　　NO,1

①	
工事名	令和7年度　木曽川水系　板橋沢第１砂防堰堤工事
工期	当初　R7.9.1～R8.6.30　　変更
受注者名	神稲建設（株）
今月作業	ー
来月作業	ー



②	
工事名	令和7年度　上松出張所管内整備工事
工期	当初　R7.10.29～R8.11.30　　変更
受注者名	大宗土建(株)
今月作業	指示1（読書残土処理場）
来月作業	準備工



③	
工事名	令和7年度　木曽川水系　小梨子沢第４砂防堰堤流路工事
工期	当初　R8.1.30～R8.9.30　　変更　　R8.12.24
受注者名	木曽土建工業（株）
今月作業	2号床固め本体工（型枠組立・打設）
来月作業	2号床固め本体工（型枠組立・打設）　流路付属物設置工（重力式擁壁）



④	
工事名	令和7年度　木曽川水系　太田第１砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初　R8.1.30～R8.9.30　　変更
受注者名	奥田工業(株)
今月作業	道路土工(掘削、残土処理）法面工(植生ﾏｯﾄ)、9/30完成検査
来月作業	ー



⑤	
工事名	令和7年度　木曽川水系　和合蛇抜沢沈砂地施設整備工事
工期	当初　R8.3.12～R9.1.31　　変更
受注者名	大宗土建(株)
今月作業	コンクリート副堰堤工
来月作業	コンクリート副堰堤工



⑥	
工事名	令和7年度　木曽川水系　桂川第１砂防堰堤工事
工期	当初　R8.3.18～R9.2.26　　変更
受注者名	大宗土建(株)
今月作業	コンクリート堰堤本体工
来月作業	コンクリート堰堤本体工、作業土工、コンクリート側壁工



⑦	
工事名	令和7年度　木曽川水系　地蔵沢第１砂防堰堤工事
工期	当初　R8.3.23～R9.1.29　　変更
受注者名	大宗土建(株)
今月作業	掘削、転石破砕、土砂等運搬、仮水路、植生工
来月作業	掘削、転石破砕、土砂等運搬



⑧	
工事名	令和8年度　木曽川水系　深沢砂防堰堤工事
工期	当初　R8.5.7～R9.2.26　　変更
受注者名	奥田工業(株)
今月作業	コンクリート堰堤工
来月作業	コンクリート堰堤工、後片付け



工事進捗状況　（令和８年　９月末）

上松出張所　　NO,2

⑨	
工事名	令和8年度　木曽川水系　戦沢第２砂防堰堤工事
工期	当初　　R8.6.1～R9.2.26　　変更
受注者名	木曽土建工業（株）
今月作業	排水構造物工、仮設工
来月作業	砂防土工、仮設工、舗装工



⑩	
工事名	令和8年度　木曽川水系　浦川第２砂防堰堤施設改築工事
工期	当初　　R8.6.8～R9.2.26　　変更
受注者名	奥田工業(株)
今月作業	コンクリート堰堤工（差し筋、型枠、打設）
来月作業	コンクリート堰堤工（差し筋、型枠、打設）



⑪	
工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事
工期	当初　　R7.7.8～R8.2.27　　変更　　R9.1.20
受注者名	(株)ミライト・ワン
今月作業	配管埋設作業
来月作業	配管埋設作業、アスファルト再舗装



⑫	
工事名	令和8年度　木曽川水系　板橋沢第１砂防堰堤付替道路工事
工期	当初　　R8.9.24～R9.6.30　　変更
受注者名	神稲建設（株）
今月作業	施工計画
来月作業	準備工



⑬	
工事名	令和8年度　木曽川水系　太田第１砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初　　R8.10.5～R9.6.30　　変更
受注者名	奥田工業(株)
今月作業	ー
来月作業	施工計画、準備工



⑭	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑮	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	


⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

工事進捗状況　（令和８年９月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①

工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事
工期	当初 R7.9.2～R9.2.26　　変更
受注者名	㈱中島工務店
今月作業	擁壁工 補強土壁工(1,2,3,4号)、仮設法面(5,6号)、道路土工(鶴城掘削)
来月作業	擁壁工 補強土壁工(1,2,3,4,18,19,20,21号)、仮設法面(5,6号)

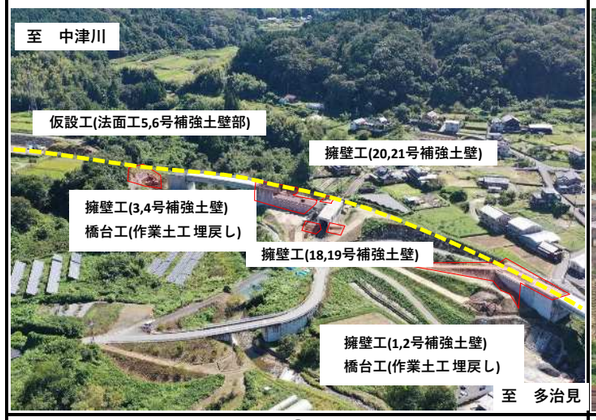


②

工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事
工期	当初 R7.10.20～R9.2.26　　変更
受注者名	㈱加藤工務店
今月作業	道路土工　　排水構造物工　仮設工
来月作業	道路土工　　排水構造物工　仮設工




③

工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事
工期	当初 R7.10.29～R9.2.26　　変更　R7.10.29～R9.3.26
受注者名	㈱鳴海組
今月作業	作業土工(土質改良)、橋台工(3号橋A2,4号橋A1,A2)
来月作業	道路土工(残土処理)、橋台工(3号橋A2,4号橋A1,A2)

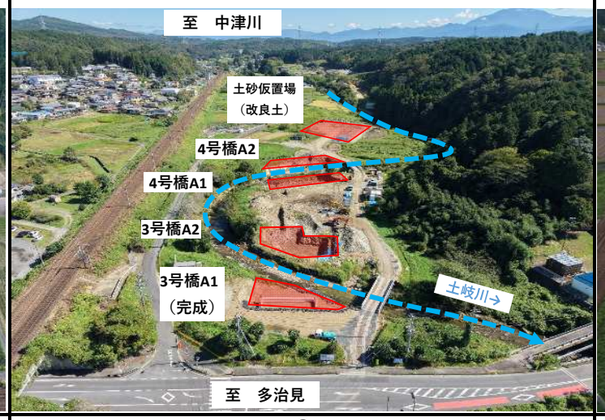


④

工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 町屋地区道路建設工事
工期	当初 R8.1.23～R9.2.26　　変更
受注者名	板垣建設㈱
今月作業	道路土工、8号横断函渠、法面工
来月作業	道路土工、8号横断函渠、排水構造物工

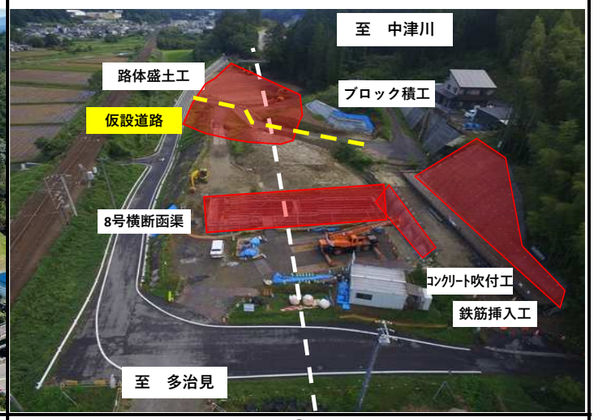


⑤

工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 公文垣内地区整備工事
工期	当初 R8.4.1～R9.2.26　　変更
受注者名	㈱加藤工務店
今月作業	地盤改良工、排水構造物工、仮設工
来月作業	道路土工、地盤改良工、排水構造物工、仮設工

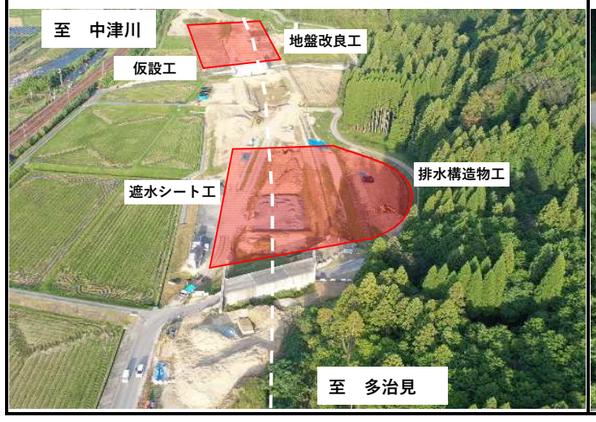


⑥

工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 上平地区整備工事
工期	当初 R8.4.1～R9.2.26　　変更
受注者名	㈱中島工務店
今月作業	準備工、道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
来月作業	準備工、道路土工、排水構造物工、仮設工

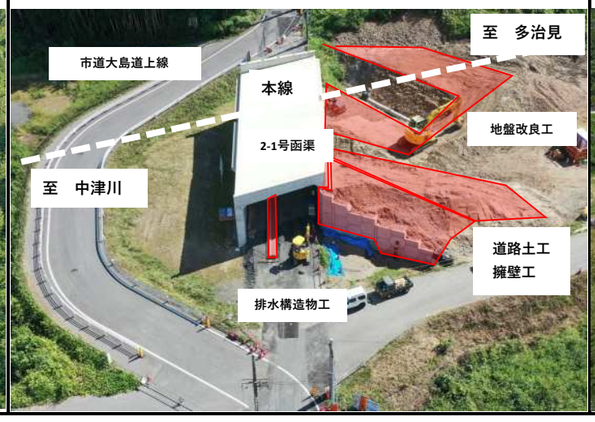

⑦

工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 恵那7号橋下部工事
工期	当初 R8.1.23～R9.2.26　　変更
受注者名	㈱吉川工務店
今月作業	橋台工
来月作業	橋台工、擁壁工

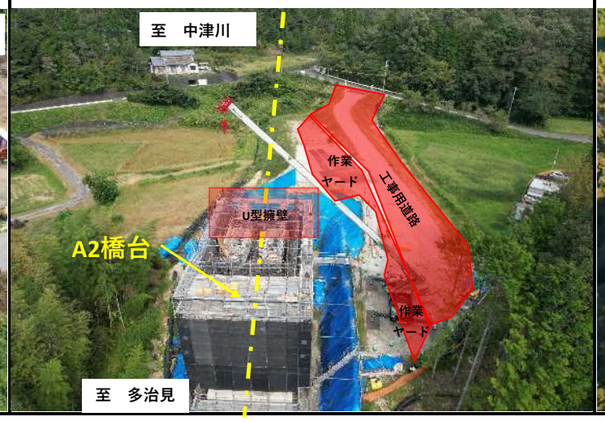

⑧


工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 建設工事
工期	当初 R8.4.1～R9.2.26　　変更　R8.4.1～R9.3.30
受注者名	セントラル建設㈱
今月作業	早曽洞地区：道路土工　鶴城地区：カルバート工　道路土工
来月作業	早曽洞地区：道路土工　鶴城地区：仮設工　道路土工　排水構造物



⑨	
工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 早曽洞地区整備工事
工期	当初 R8.4.1～R9.2.26　　変更　R8.4.1～R9.3.30
受注者名	㈱吉川工務店
今月作業	早曽洞：切土、土砂搬出　中切：擁壁工　新田：土工
来月作業	早曽洞：切土工、土砂搬出　中切：補強土壁工　新田　：土工




⑩	
工事名	令和７年度　瑞浪恵那道路 早曽洞地区道路建設工事
工期	当初 R8.4.1～R9.2.26　　変更　R8.4.1～R9.3.30
受注者名	恵中建設㈱
今月作業	早曽洞地区：掘削工、土砂等運搬　新田地区：擁壁工、排水構造物工
来月作業	早曽洞地区：掘削工、土砂等運搬　新田地区：擁壁工、排水構造物工

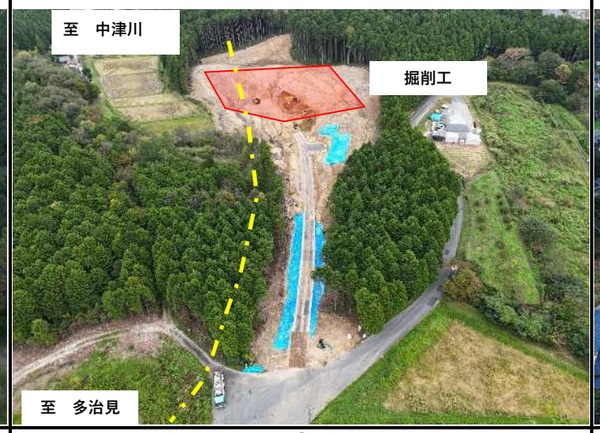


⑪	
工事名	令和８年度　瑞浪恵那道路 名滝地区東部道路建設工事
工期	当初 R8.6.2～R9.1.29　　変更
受注者名	板垣建設㈱
今月作業	・道路土工　掘削工・法面工　法面吹付工、鉄筋挿入工・仮設盛土
来月作業	・道路土工　掘削工、残土処理工・法面工　法面吹付工、鉄筋挿入工




⑫	
工事名	令和８年度　瑞浪恵那道路 公文垣内地区東部道路建設工事
工期	当初 R8.6.15～R9.1.29　　変更
受注者名	宮島建設㈱
今月作業	地盤改良工、重力式擁壁工
来月作業	道路土工、重力式擁壁工

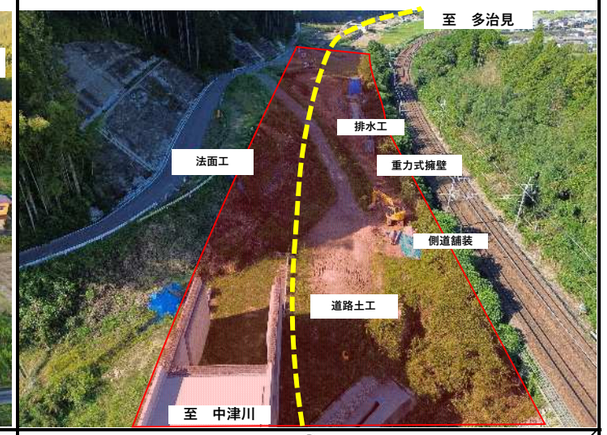

⑬	
工事名	令和８年度　瑞浪恵那道路 恵那7号橋下部工事
工期	当初 R8.9.14～R10.2.29　　変更
受注者名	㈱吉川工務店
今月作業	準備工
来月作業	仮設工

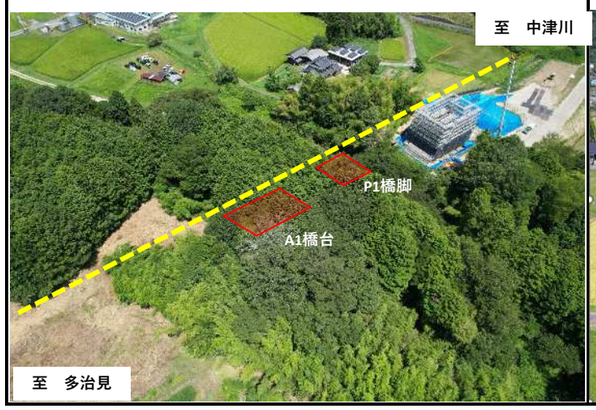

⑭	
工事名	令和８年度　瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事
工期	当初 R8.9.15～R9.5.31　　変更
受注者名	板垣建設㈱
今月作業	準備工
来月作業	準備工、土工（名滝地区）

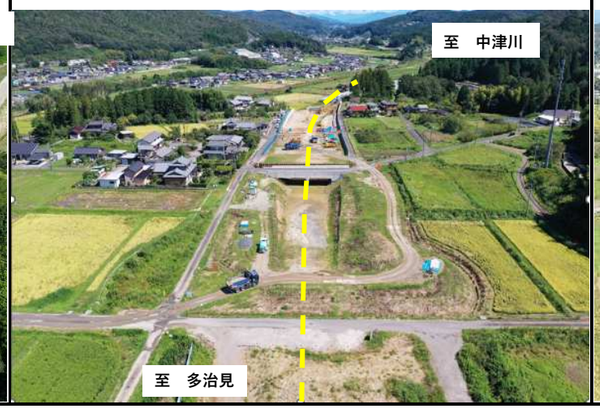

⑮	
工事名	令和８年度　瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事
工期	R8.10.5～R9.5.31　　変更
受注者名	㈱中島工務店
今月作業	
来月作業	準備工



⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

工事進捗状況　（令和8年9月末）

瑞浪国道維持出張所

①	
工事名	令和7年度　多治見国道西部維持修繕工事
工期	当初 R7.10.1～R10.10.31　　変更
受注者名	日本ハイウエイサービス（株）
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他



R19(上) 54.0kp　道路除草工

②	
工事名	令和6年度　多治見国道東部維持修繕工事（R8）
工期	当初 R6.10.1～R9.10.31　　変更
受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス
今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工
来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工



R19　90.600下　緑地管理工（道路除草）

③	
工事名	令和6年度　多治見国道管内橋梁補修工事　完
工期	当初　R7.3.27～R8.2.27　　変更　　R8.5.29
受注者名	梅田組㈱
今月作業	完成
来月作業	




R19　42.5kp　日の出第2橋側歩道橋（上）

④	
工事名	令和7年度　多治見国道中津川地区整備工事　完
工期	当初　R7.10.1～R8.2.27　　変更　　R8.9.18
受注者名	㈱加藤工務店
今月作業	擁壁工（7号地山補強土工：伐採工）
来月作業	準備工



⑤	
工事名	令和7年度　多治見国道橋梁補修工事
工期	当初　R8.1.8～R9.7.30　　変更
受注者名	㈱梅田組
今月作業	橋梁付属物工、橋梁地覆補修工、排水施設工
来月作業	橋梁付属物工、舗装工

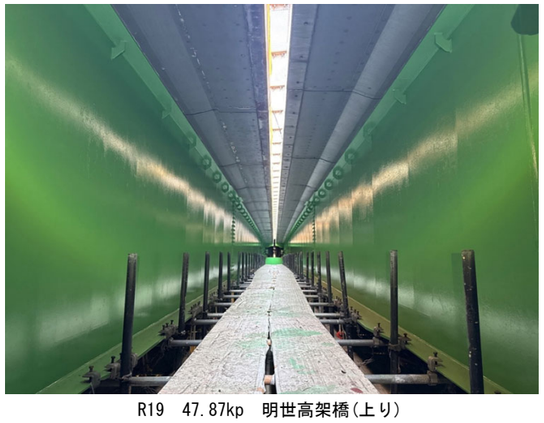

R19　47.87kp　明世高架橋(上り)

⑥	
工事名	令和7年度　多治見国道道路照明設備工事
工期	当初　R8.3.26～R9.2.26　　変更　　R9.3.19
受注者名	NDS（株）
今月作業	現地調査、資材手配
来月作業	道路照明設備設置工




R21　3.170kp　定林寺横断歩道橋

⑦	
工事名	令和7年度　多治見国道亜炭坑充填工事
工期	当初　R8.4.1～R8.10.30　　変更
受注者名	徳倉建設（株）
今月作業	地下空洞充填工(充填工)
来月作業	共通仮設費(確認ボーリング)



R21 16.2kp付近 充填状況

⑧	
工事名	令和7年度　多治見国道CCTV設置工事
工期	当初　R8.4.1～R9.2.26　　変更
受注者名	エフコム（株）
今月作業	現地調査、設計照査
来月作業	現地調査、資材手配

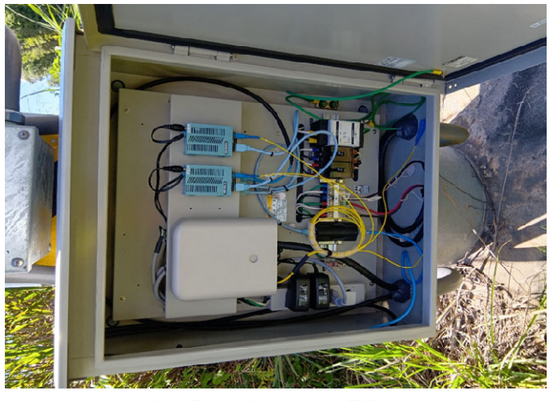

R19 長島情報板　機側装置調査

⑨	
工事名	令和7年度　多治見国道管内橋梁補修工事
工期	当初　R8.4.1～R9.2.26　　変更
受注者名	（株）梅田組
今月作業	橋梁床版工、舗装工、橋梁付属物工、橋梁補修工
来月作業	舗装工、橋梁床版工、橋梁補修工



R19　70.99kp恵那大橋(上り)

⑩	
工事名	令和8年度　多治見国道交通事故対策工事
工期	当初　R8.5.11～R8.12.25　　変更
受注者名	セントラル建設（株）
今月作業	区画線工、薄層ｶﾗｰ舗装工、構造物撤去工、排水構造物
来月作業	構造物撤去工、排水構造物工



山野内地区

⑪	
工事名	令和８年度　多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初　R8.8.17～R9.2.26　　変更
受注者名	㈱加藤工務店
今月作業	準備工
来月作業	準備工



⑫	
工事名	令和８年度　多治見国道橋梁補修工事
工期	当初　R8.9.1～R9.2.28　　変更
受注者名	（株）梅田組
今月作業	準備工
来月作業	恵那地区　仮設工-足場工



R19　94.7kp　井戸沢橋

⑬	
工事名	令和8年度　多治見国道管内整備工事
工期	当初　R8.10.01～R9.02.26　　変更
受注者名	セントラル建設（株）
今月作業	準備工
来月作業	準備工



中津地区(中津川IC)
