高山国道事務所

中部縦貫道ニュース

令和８年　１１月号


発行：中部縦貫道支部安全協議会

日頃は中部縦貫道建設工事にご協力を賜りありがとうございます。
11月になり朝夕の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
皆様のご協力も有り、今年度も無事に工事を進めることができております。
また、約4年半続いた坊方トンネル工事が竣工を迎えました。
地元住民の皆様方には長期にわたり、ご理解とご協力をいただきありがとうございました。
日ごとに寒さが増す季節となりますが、中部縦貫道支部安全協議会は、
引き続き安全第一に努め地元住民の皆様方への配慮を忘れず工事を進めてまいります。
今後ともご理解とご協力をよろしくお願い致します。　　～中部縦貫道工事関係者一同～

	施工会社	工　事　名		施工会社	工　事　名
完	（株）安藤・間	令和３年度 中部縦貫坊方トンネル工事	6	ナガイ（株）	令和７年度 中部縦貫上野東地区道路建設工事
2	（株）安部日鋼工業	令和７年度 中部縦貫稲部谷橋PC上部工事	7	（株）新井組	令和７年度 中部縦貫上野西地区道路建設工事
3	（株）新井組	令和７年度 中部縦貫岩井沢橋整備工事	8	（株）長瀬土建	令和８年度 中部縦貫上切地区道路建設工事
4	（株）林工務店	令和７年度 中部縦貫町方地区道路建設工事	9	ナガイ（株）	令和８年度 中部縦貫中切地区道路建設工事
5	大山土木（株）	令和７年度 中部縦貫新張地区道路建設工事			

※赤色は新規工事

中部縦貫自動車道　施工位置図

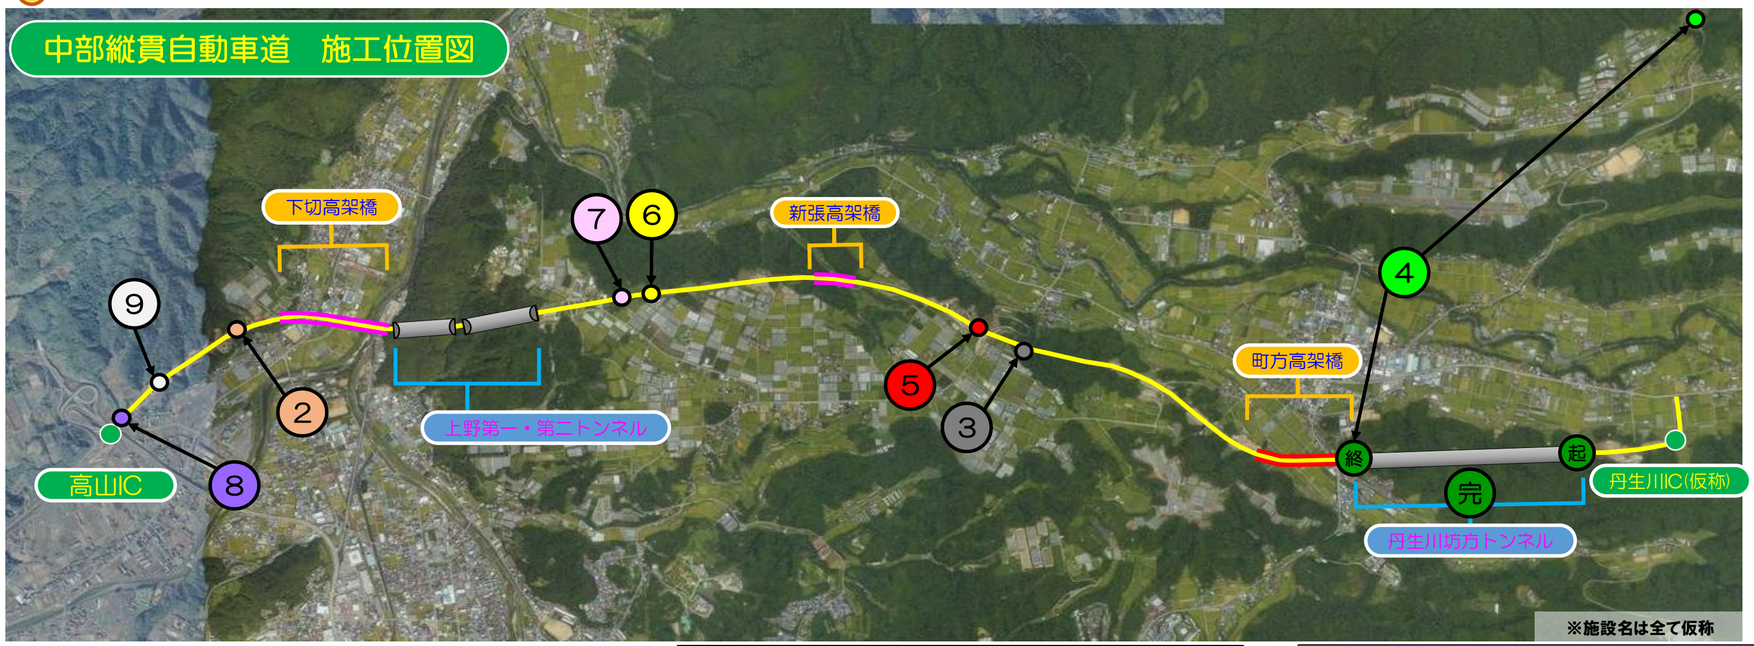

中部縦貫道建設工事の進捗状況をご報告


完成

工　期	R4.1.18　～　R8.7.31	進捗率（R.8.7月末）	100.0%
工事内容	丹生川坊方トンネル（1422m）施工		
施工会社から一言!!	皆様のご協力により無事にトンネルが完成しました。		

起点側【R8.７月末】



終点側【R8.７月末】

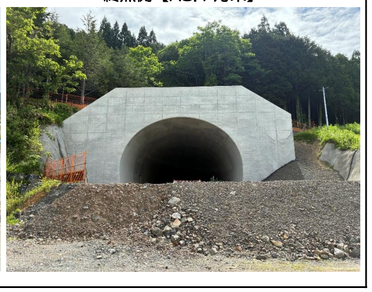

～新たに仲間入りする工事のご紹介～

⑧

工事名	令和8年度 中部縦貫上切地区道路建設工事
工　期	R8.8.5～R9.3.26
会社名	(株)長瀬土建
担当者	現場代理人：荒井　幹也 監理技術者：石原　英二

上切地区において土工事や擁壁を造り、新しい道路へ切り替える準備を行います。工事期間中、大型車両などの工事関係車両が出入りをしますが、一般車両を優先して走行します。地域住民の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、無事故・無災害で進めていきますので、何卒ご理解、ご協力頂けますようよろしくお願い致します。

⑨

工事名	令和8年度 中部縦貫中切地区道路建設工事
工　期	R8.8.7～R9.3.26
会社名	ナガイ(株)
担当者	現場代理人：岩田　浩樹 監理技術者：栗瀬　成基

中切地区において土工事、擁壁を造る工事を行います。工事期間中は、県道や市道を使用し資材や重機を搬入することがありますが、一般車両優先で無事故・無災害で工事を進めてまいります。近隣住民の方にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。



2つの工事が新たに始まりました。
安全第一で行っていきます。
ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

②

工　期	R8.1.19　～　R9.3.26	進捗率（R.8.10月末）	98.9%
残り工事内容	橋梁足場・橋梁防護撤去		
施工会社から一言!!	残りあとわずかですが、引き続きご協力お願いします。		

【R8.4月末】



【R8.10月末】



③

工　期	R8.3.19　～　R9.1.29	進捗率（R.8.10月末）	60.0%
残り工事内容	道路土工・防護柵工・法面工施工		
施工会社から一言!!	工事期間中は、一般車両優先で工事を進めて行きます。		

【R8.4月末】



【R8.10月末】




④

工　期	R8.4.1　～　R9.2.26	進捗率（R.8.10月末）	57.3%
残り工事内容	町方地区：軽量盛土工・排水構造物工施工 大萱地区：残土受入地造成		
施工会社から一言!!	大萱の施工が完了間近となってますので引き続きお願い致します。		

大萱地区【R8.4月末】



大萱地区【R8.10月末】



⑤

工　期	R8.4.1　～　R9.2.26	進捗率（R.8.10月末）	75.0%
残り工事内容	盛土工施工		
施工会社から一言!!	現在、年内完成に向けて路体盛土工主体で施工を進めております。		

【R8.4月末】



【R8.10月末】




⑥

工　期	R8.3.17　～　R9.2.26	進捗率（R.8.10月末）	58.2%
残り工事内容	プレキャスト水路設置、路体盛土工施工		
施工会社から一言!!	上野用水の付替え工事を行っております。ご協力をお願いします。		

【R8.4月末】



【R8.10月末】



⑦

工　期	R8.4.1　～　R9.2.26	進捗率（R.8.10月末）	70.5%
残り工事内容	掘削工・法枠工・鉄筋挿入工施工		
施工会社から一言!!	工事期間中は一般交通の安全を最優先に確保して工事を進めます。		

【R8.4月末】



【R8.10月末】

