
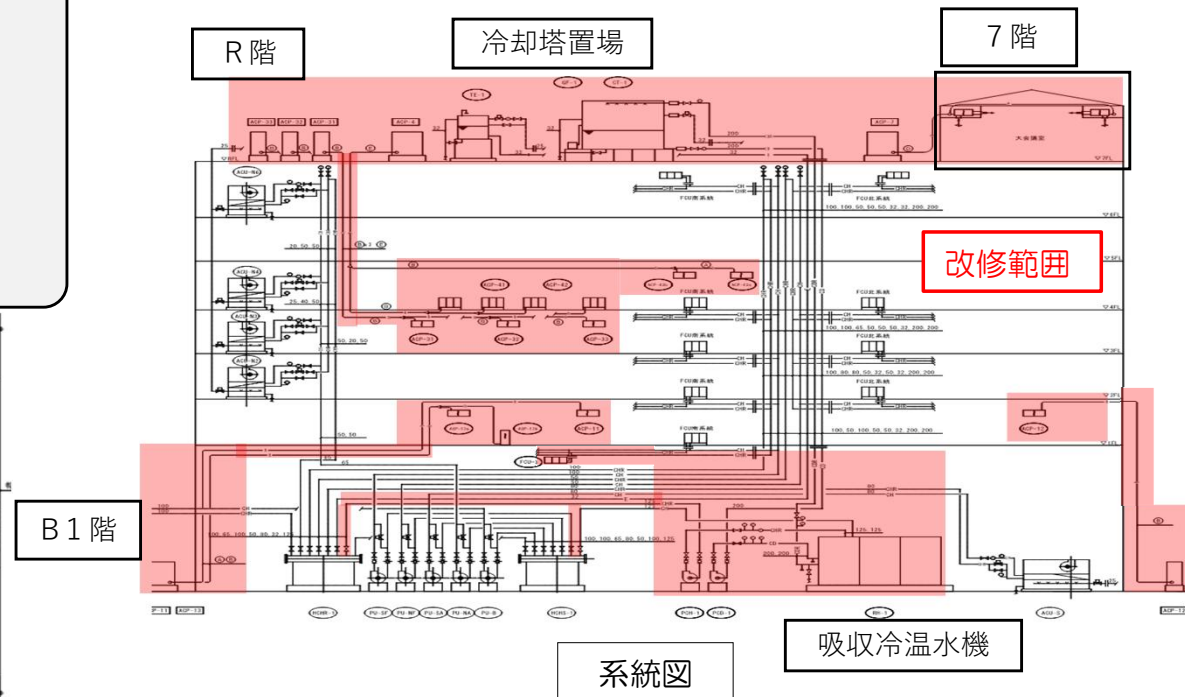


【工事概要】 令和7年度 岐阜法務総合庁舎空調設備改修工事

（施設概要）

- 工事場所：岐阜県岐阜市美江寺町2丁目8
- 建物概要：SRC造 / 地上7階建（地下1階） / 延べ面積 6,672㎡
- 工期：令和8年4月1日から令和9年2月24日まで
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで）
＜余裕期間制度（発注者指定方式）＞
※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。
- 工事内容：① 空調設備（熱源設備、空調機、など）の改修を行う。
② ①に伴う建築及び電気設備の改修を行う。

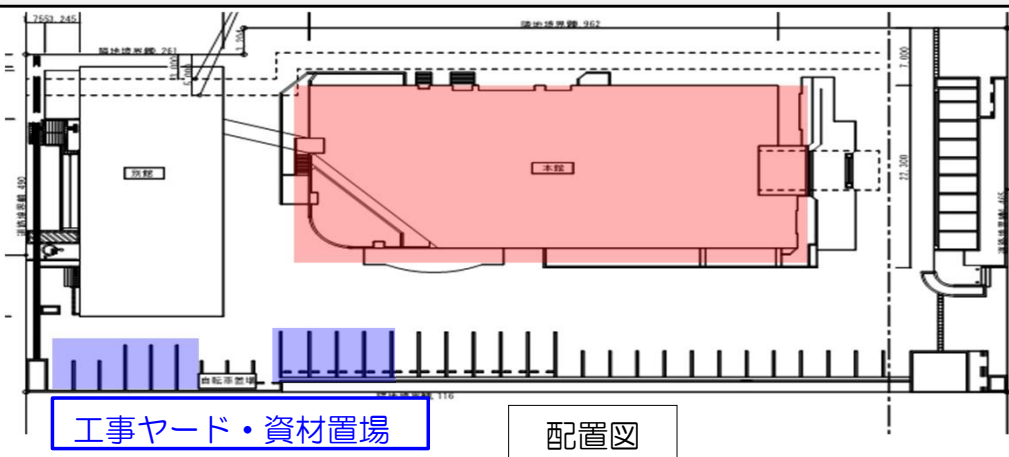

概略工事工程表（参考）

月	令和8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年1月	2月
機械設備工事	準備期間・調査			製作期間			機械室内・執務室改修、試運転・検査				
建築工事				準備期間・調査			機械室内・執務室改修				
電気設備工事				準備期間・調査			機械室内・執務室改修				
空調稼働状況				冷房シーズン						暖房シーズン	

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。
なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動への対策については、契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより工事費用や工期の変更が必要となった場合には、適切に対応します。
