



# 【工事概要】 令和8年度 名古屋第2地方合同庁舎空調設備改修工事 (発注規模：300百万円以上810百万円未満)

※入札情報サービスより

- 工事場所：名古屋市中区三の丸2丁目5-1
- 建物概要：庁舎 SRC造 地上8階 地下2階 塔屋1階  
延べ面積 24,378㎡
- 工期：令和8年9月1日から令和10年3月6日まで  
(余裕期間：契約締結日の翌日から令和8年8月31日まで)  
＜余裕期間制度（発注者指定方式）＞

※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要です。

- 工事概要：①新館3階-8階、PH1階の空調機の撤去・新設を行う。
- ② ①に伴うダクト・配管の改修を行う。
- ③ ①に伴う建築、電気設備の改修を行う。

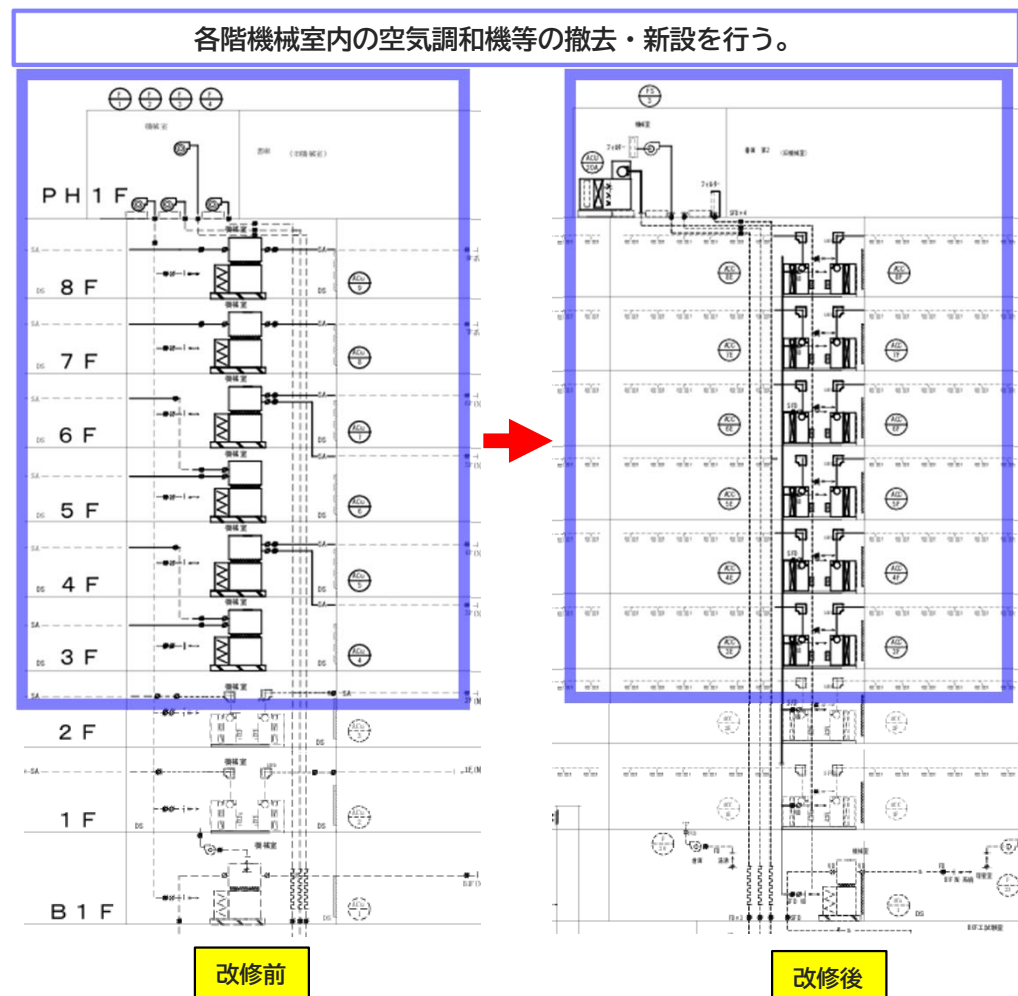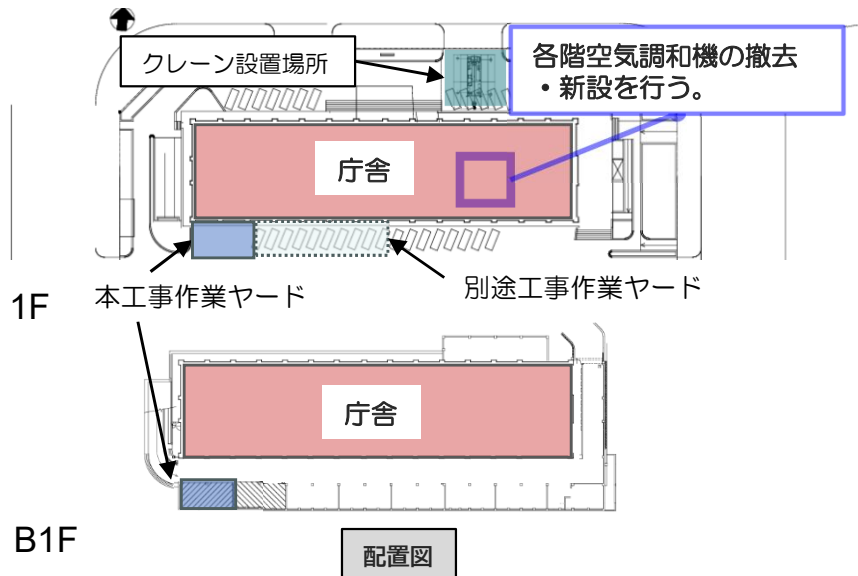

## 概略工程表（想定）

年度	令和8年度							令和9年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
冷房・暖房期間				暖房期間				空調停止期間			冷房期間			空調停止期間			暖房期間		
空調改修	工事着手	3F~6F工事準備						7F~RF工事準備						7F~RF工事準備					片付け・検査
				3F~6F工事期間				7F~RF工事準備						7F~RF工事準備					片付け・検査

※本概略工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後、受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。

なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動への対策については、契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより、工事費用や工期の変更が必要となった場合には、適切に対応します。
