


【工事概要】 令和7年度 名古屋第1 地方合同庁舎空調設備改修工事

（施設概要）

- 工事場所：名古屋市中区三の丸2丁目2-1
- 建物概要：SRC造 / 地上11階 地下2階 塔屋1階建 / 延べ面積 24,050.69㎡
- 工期：令和7年9月1日から令和8年7月29日まで
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和7年8月31日まで）
＜余裕期間制度（発注者指定方式）＞
※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。
- 工事内容：① 庁舎の熱源設備（冷温水発生機、冷却塔、ポンプ類）改修を行う。
② ①に伴う建築、電気設備改修を行う。


（工事概要図）

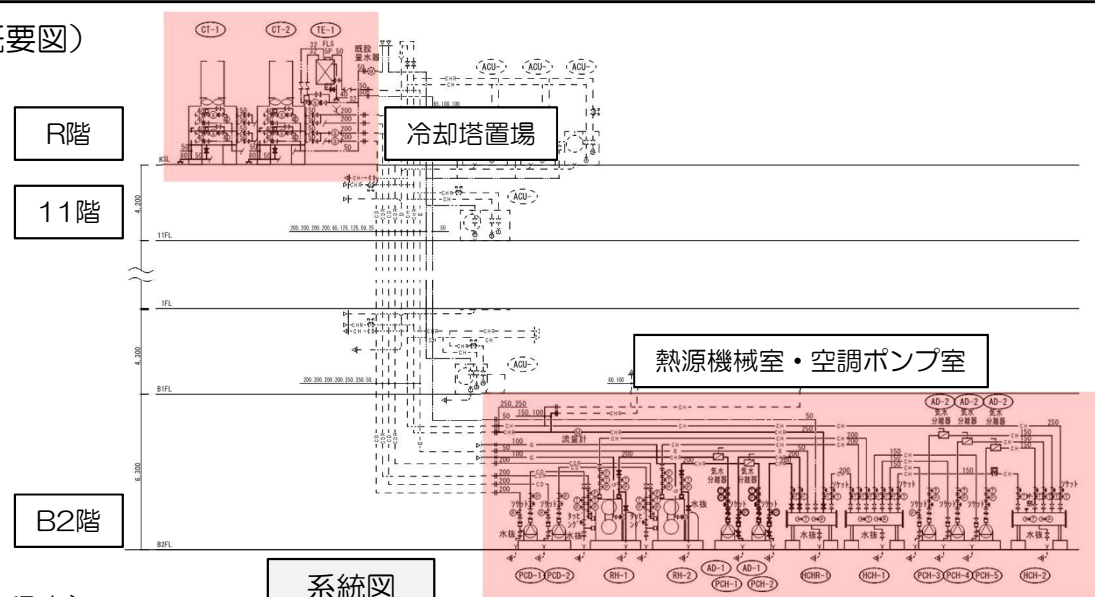

系統図

（概略工程表）

年月	令和7年9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
熱源設備改修工事	準備期間・調査				製作期間				現場作業		試運転・検査
空調稼働状況	冷房期間				暖房期間						冷房期間

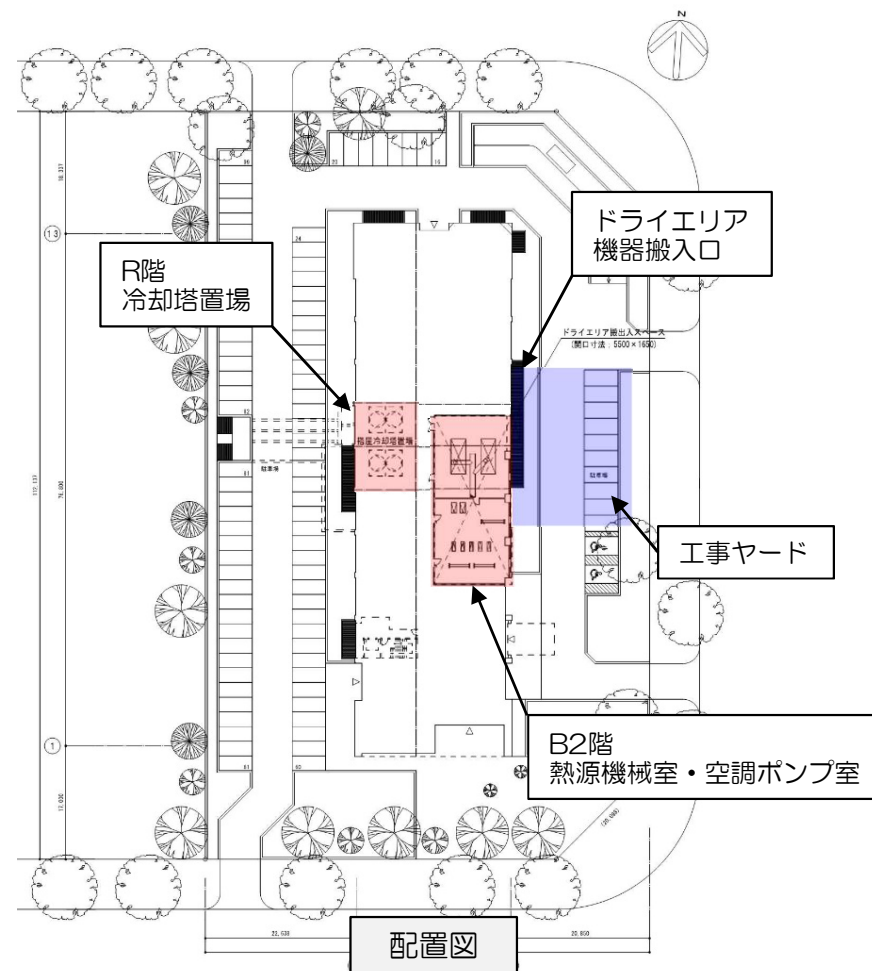

配置図

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。また、概略工程表は想定であり、任意着手方式の場合は、工事着手期限までの期間で受注者が設定することになります。なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します

◆資材等の価格変動等への対策について：契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより工事費用や工期の変更が必要となった場合等には、契約書に基づき変更契約を行うなど適切に対応します。
