
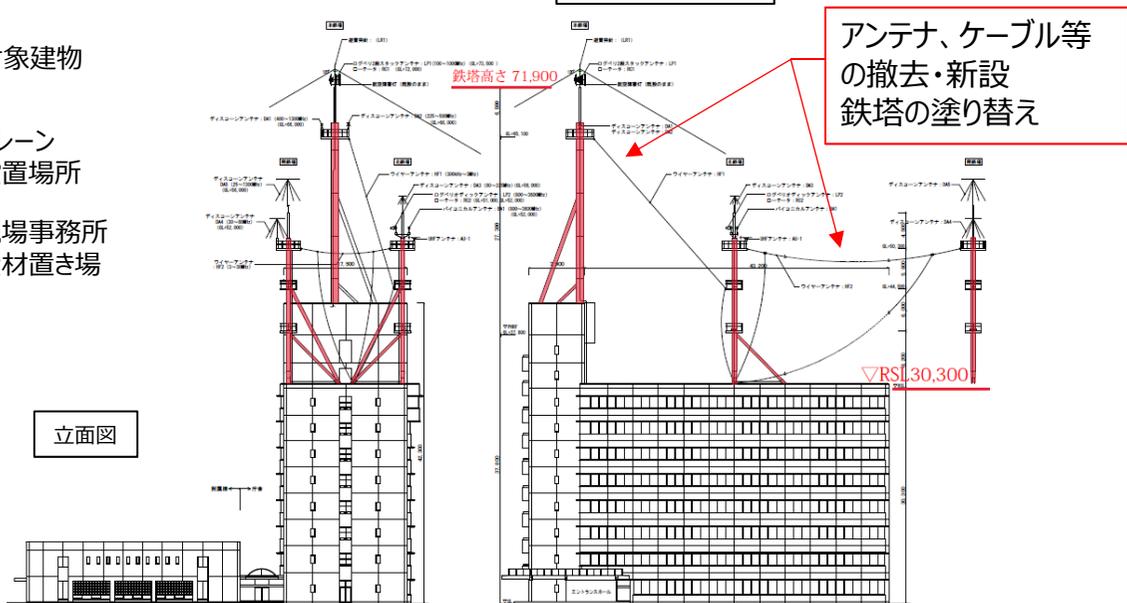
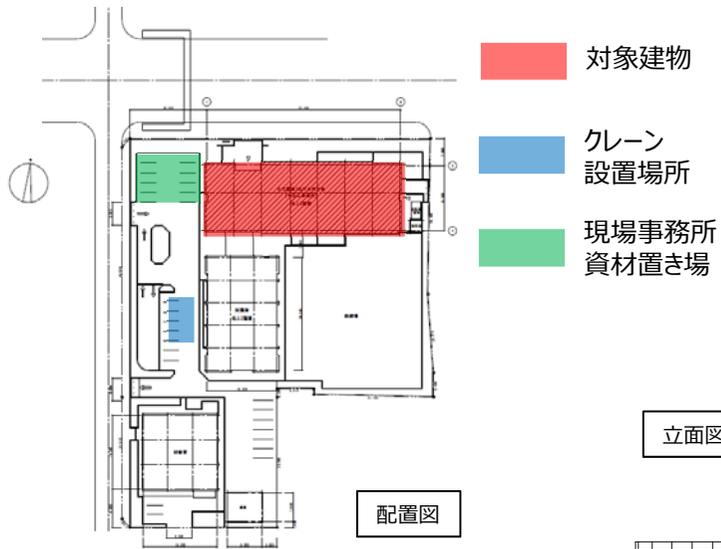


# 【工事概要】 令和3年度 名古屋第3地方合同無線鉄塔通信設備改修工事

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。

入札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。

- 工事場所：愛知県名古屋市東区白壁1丁目15-1
- 建物概要：庁舎 SRC造 地上8階建 地下1階 塔屋2階  
延べ面積 8,613㎡
- 工期：契約日の翌日から令和4年3月28日まで（10ヶ月）
- 工事概要：①アンテナ、ケーブル等通信設備の撤去新設を行う。  
②鉄塔の塗り替えを行う。

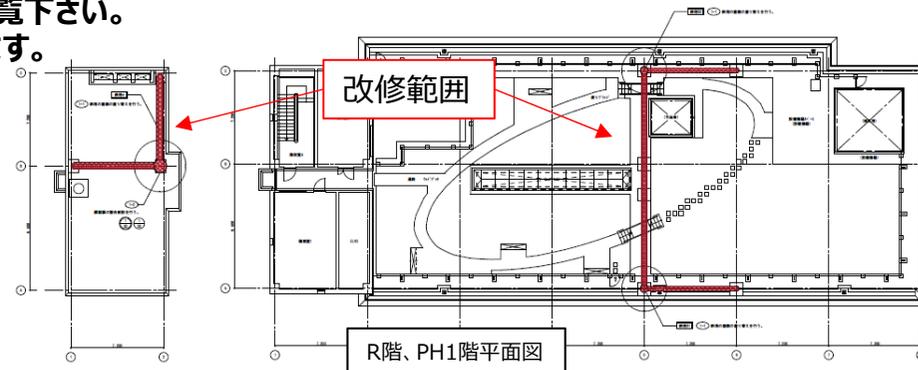

概略工事工程表（参考図）

年度	令和3年度										
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
電気設備工事	準備工			機器製作(6か月)					通信機器撤去新設		調整・検査
建築工事			準備工					足場設置・鉄塔塗装・足場解体		検査	

◆現場作業期間は令和3年12月から令和4年3月を想定しています。

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆新型コロナウイルス感染症について：契約後に新型コロナウイルス感染症による資機材調達等へ影響が出た場合は、別途協議いたします
